

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวเพ็ญภา แสนไชย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๕๔๗๖๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำบาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๘๖๕.๑๖ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ที.วี.พี. การโยธา  
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๘๖๘.๑๖ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้า บาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอคำชะอี จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

**ข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

นางหทัยส่วนจำกัด  
ที่ ร.พ. การโยธา  
261 หมู่ 1 ต.บ้านคำชะอี  
(นางสาวเพ็ญภรณ์ เชียงใหม่ ขอนแก่น)


**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง


ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
ความสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวเพ็ญภา แสนไชย)

(ลงชื่อ)..........ผู้ลงหุ้นส่วนจำกัด

(นางสาวรัชณี สุทธิรุ่ง) การโยธา

(ลงชื่อ).......... 26.1. พ.ศ. 1. ต. พิชนพระ  
(นางน้ำฝน จิงครระภูติ) จ. ขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากหน้างานไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถ  
ดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๗  
พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ  
ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้าง ฯ ออกไปอีก จำนวน ๑๒ วัน นับจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  
๒๕๖๗ - วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้  
รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำบง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะอาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอ  
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๐๘/๒๕๖๗	๔๒๖,๐๐๐.๐๐			๔๒๖,๐๐๐.๐๐

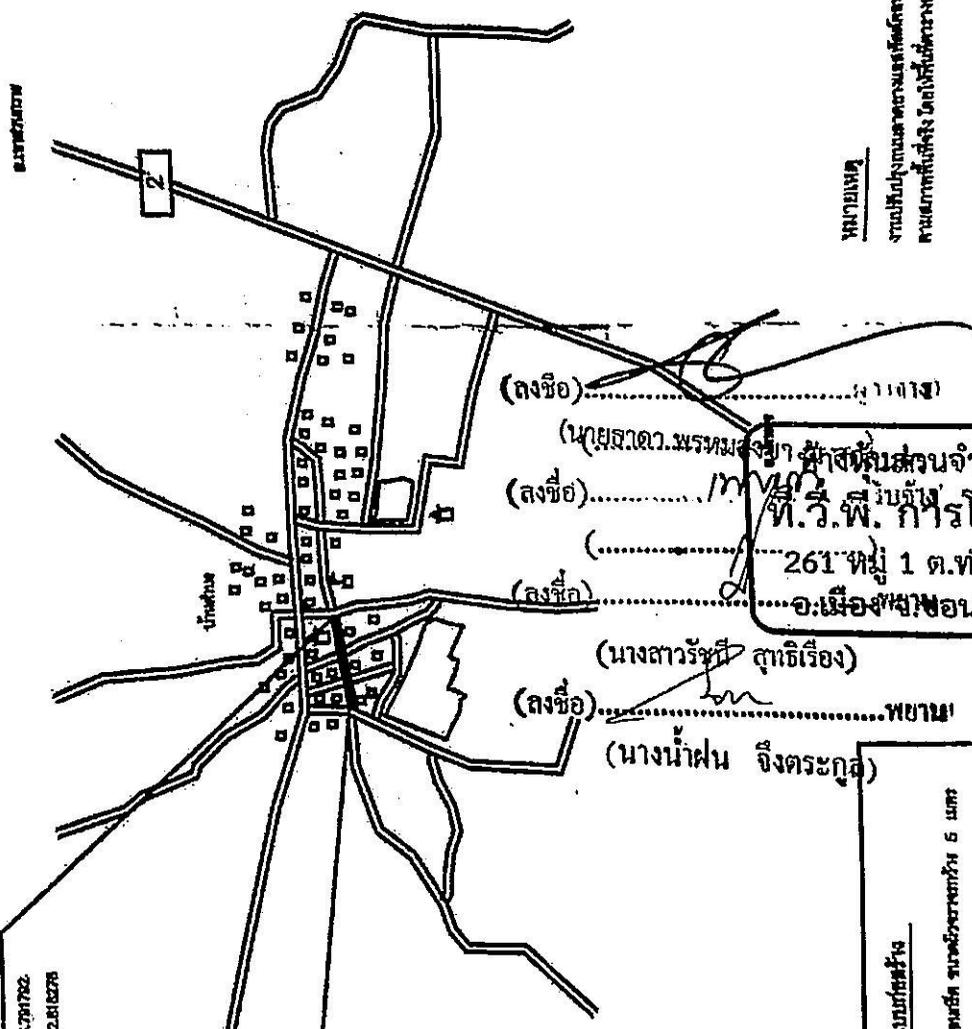




# แบบแปลน

ศูนย์พัฒนาฯ หมู่ที่ ๖-๗๖๐  
 ๓-๓/๓๓ 15.701702  
 ๓๓๓/๓๓ 102.810278

ศูนย์พัฒนาฯ หมู่ที่ ๖๖๖๐  
 ๓-๓/๓๓ 18.782870  
 ๓๓๓/๓๓ 102.8๑๐488



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางวราพร หางษ์ชนะชัยกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายอภิ ศิริชาติวิทย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายบุญสาร ศรีสุวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายศุภฤกษ์ ขามถ้ำน้อย)

**หมายเหตุ**

งานนี้ปลูกแบบตามแบบที่ส่งคืนแล้ว มิได้มีความเห็นว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดประการใด  
 ตามรายการที่แนบมา โดยให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการต่อไป



**ลงคำการรับทราบส่วนจำกัดขออนุญาต**

เลขที่	๒๖๑
วันที่รับทราบ	๒๖/๐๑/๖๖
สถานที่รับทราบ	ที่.วิ.พี. การโยธา
ชื่อผู้รับทราบ	นาย.....
ตำแหน่ง	.....
ชื่อหน่วยงาน	.....
ชื่อผู้รับทราบ	.....
ตำแหน่ง	.....
ชื่อหน่วยงาน	.....

**รายละเอียดการประกาศแบบก่อสร้าง**

1. ตามที่ได้ยื่นขอประกาศแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ขนาดพื้นที่ ๖ ไร่ ๓๓๓ ตารางวา ๓๓๓/๓๓ ๑๐๒.๘๑๐๔๘๘  
 เนื้อที่ซึ่งมีค่าก่อสร้างประมาณ 1,350,๐๐๐ บาท และในงบราชการ  
 2. ตามที่แนบมา - น.  
 ปกป้องสิทธิของเจ้าของที่ดิน - สบม.

บัญชีรายชื่อบริษัทรับจ้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านค้ำบัง หมู่ที่ 11 ตำบลชะขาด - ตำบลน้ำพอง อำเภอสีดา จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง			ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง			หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	
				ราคา/หน่วย			ราคา/งาน	
1	งานปรับพื้นที่ก่อนถม	125	ตร.ม.	72,5109	125	ตร.ม.	72,5109	9,063.86
2	งาน TACK COAT	1,350	ตร.ม.	18,4600	1,350	ตร.ม.	18,4600	24,921.00
3	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	1,350	ตร.ม.	275,5270	1,350	ตร.ม.	275,5270	371,961.45
4	งานตีเส้นจราจร	61.00	ตร.ม.	328,7490	61.00	ตร.ม.	328,7490	20,053.69
	รวมการก่อสร้างจริง			426,000.00				426,000.00
	ราคาคงตามแปลน/สัญญาจ้าง			426,000.00				426,000.00
	รวมการก่อสร้างจริง							426,000.00

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวเทัญภา แก้วสีโย)  
**นางสาวเทัญภา แก้วสีโย**  
 281 หมู่ 1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)  
**นางสาวรัชณี สุทธิเรือง**  
 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ.....  
 (นายคุณงาม)  
**นายคุณงาม**  
 (นายก อบจ.ขอนแก่น)

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิสิทธิ์ศิริกิจวิทย์)  
**นายอภิสิทธิ์ศิริกิจวิทย์**  
 (นายก อบจ.ขอนแก่น)

ลงชื่อ.....  
 (นางอรภาพร พงษ์ชนะชัยกุล)  
**นางอรภาพร พงษ์ชนะชัยกุล**  
 (ประธานกรรมการ)
