

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท วรรณกรรมก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๔ หมู่ ๕ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสาริตา
มธุรส ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๕๕๕๔๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ
มอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียน
หนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
๕๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาริตา มธุรส)
กรรมการก่อสร้าง จำกัด



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานเจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานถมดินรองพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
 - งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์เด่น พรฤณา)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิริพร ห่อหุ้ม)

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตม้านั่ง คสล. และcrib คสล. แล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน โครงสร้างโครงหลังคา(ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน)พร้อมมุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็น-คานเอ็น แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบ ไม้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย-น้ำโสโครก และท่อระบายน้ำ ของห้องน้ำ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๕,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อ

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน และฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว ผนังเจาะร่อง ผนังฉาบปูนฉาบมันเรียบ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



นางสาวศิริกมล มรรคา
ผู้อำนวยการกองช่าง

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทำพื้นผิวหินขัด พื้นบันไดหินขัด ม้านั่งหินขัด จมูกบันได PVC แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานทั้งหมดพร้อมงานเหล็กเสริม โครงฝ้าเพดานชั้น 4 แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๔๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งราวลูกกรงกันตก และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จ
 - งานปูกระเบื้องเซรามิกผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
 - งานปูกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
 - งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำ คสล. และติดตั้งฝาปิด แล้วเสร็จ
 - งานทำผิวพื้นขัดหยาบพื้นรอบอาคารชั้น ๑ และพื้นขัดมันผสมน้ำยา กันซึม แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันห้าร้อย

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งปั้มน้ำ ระบบประปาและระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พัดลมติดผนัง ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบท่อต่างๆ แล้วเสร็จ

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาริตา มธุรส)



นางสาวสาริตา มธุรส
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

- งานติดตั้งกระดานพร้อมบอร์ดด้านข้าง แล้วเสร็จ
- งานทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบการใช้งานระบบประปาและสุขาภิบาลจนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทำการทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าจนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๖๐ วัน

ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

แก้ไขเป็น

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๗๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานเจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- งานถมดินรองพื้น ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๗,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาริสา ธรรมการก่อสร้าง จำกัด)



- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาท

ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

- งานวางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

- งานวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๔,๕๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ

- งานเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตม้านั่ง คสล. และคืบ คสล. แล้วเสร็จ

- งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ

- งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน โครงสร้างโครงหลังคา(ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน)พร้อมมุงหลังคาและส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาริสา มีสุริยกุลก่อสร้าง)



งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๕,๘๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็น-คานเอ็น แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งวงกบไม้ แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย-น้ำโสโครก และท่อระบายน้ำ ของห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๑,๕๗๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฉาบปูนภายนอก - ภายใน และฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว ผนังเซาะร่อง ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทำพื้นผิวหินขัด พื้นบันไดหินขัด ม้านั่งหินขัด จมูกบันได PVC แล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดานทั้งหมดพร้อมงานเหล็กเสริม โครงฝ้าเพดานชั้น ๔ แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๘,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวลูกกรงกันตก และส่วนประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องเซรามิกผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องเซรามิกพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำ คสล. และติดตั้งฝาปิด แล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้นขัดหยาบพื้นรอบอาคารชั้น ๑ และพื้นขัดมันผสมน้ำยา กันซึม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ตู้ MDB ,ตู้ Load Center พร้อมสายและท่อไฟสายเมนเข้าอาคาร
- งานติดตั้งบันไดลิ้ง
- งานเทลาน คสล. เพิ่มเติม พร้อมทำผิวขัดหยาบ
- งานติดตั้งปั้มน้ำ ระบบประปาและระบบสุขาภิบาลทั้งหมด. แล้วเสร็จ

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรฤณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสาริณี วัฒนศิริ)



- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบบท่อต่าง ๆ แล้วเสร็จ

- งานทาสีกันซึมผนังอาคารแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๔,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งประตูพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๑,๕๗๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เสารั้ว พัดลมติดผนัง พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๗,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งกระดานพร้อมบอร์ดด้านข้าง แล้วเสร็จ

- งานทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ

- งานติดตั้งบัวเชิงผนัง แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบการใช้งานระบบประปาและสุขาภิบาลจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- ทำการทดสอบการใช้งานระบบไฟฟ้าจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

ตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๖๐ วัน

ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจดน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสารี สิริบุญเรือง)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้
กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ
ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความใน
เงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรกมล)

(ลงชื่อ).....

กษ

(นางสาวสาริตา มหิธร)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขแบบรูปราชการงานก่อสร้างโดยเปลี่ยนแปลงลดความยาวเสาเข็มตอก และทาสีกันซึมผนังด้านข้าง อาคารทั้งสองฝั่ง พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคาร เปลี่ยนชนิดจากกระดานดำเป็นกระดาน ไวท์บอร์ด และการแก้ไขรายละเอียดวงจรวางงานและเงินงบประมาณในวงจรวางงาน จากเดิม ๑๑ วงด แก้ไขเป็น ๑๒ วงด


ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๖๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จนถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
ราชการ ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง

วงจรวางงาน	วงจรวางงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	๑,๑๐๕,๗๗๐.๐๐			๑,๑๐๕,๗๗๐.๐๐
๒	๒	๐๓/๐๑/๒๕๖๘	๑,๒๐๗,๔๕๐.๐๐			๑,๒๐๗,๔๕๐.๐๐
๓	๓	๒๓/๐๑/๒๕๖๘	๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐			๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐
๔	๔	๑๖/๐๒/๒๕๖๘	๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐			๑,๒๒๐,๑๖๐.๐๐
๕	๕	๒๓/๐๓/๒๕๖๘	๑,๐๕๔,๕๓๐.๐๐			๑,๐๕๔,๕๓๐.๐๐
๖	๖	๐๓/๐๔/๒๕๖๘	๗๔๕,๘๕๐.๐๐			๗๔๕,๘๕๐.๐๐
๗	๗	๒๑/๐๖/๒๕๖๘	๘๕๑,๕๗๐.๐๐			๘๕๑,๕๗๐.๐๐
๘	๘	๓๑/๐๗/๒๕๖๘	๑,๑๑๘,๔๘๐.๐๐			๑,๑๑๘,๔๘๐.๐๐
๙	๙	๑๐/๐๘/๒๕๖๘	๑,๑๕๘,๒๕๐.๐๐			๑,๑๕๘,๒๕๐.๐๐
๑๐	๑๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๘	๘๖๔,๒๘๐.๐๐			๘๖๔,๒๘๐.๐๐
๑๑	๑๑	๓๐/๑๐/๒๕๖๘	๘๕๑,๕๗๐.๐๐			๘๕๑,๕๗๐.๐๐
๑๒	๑๒	๑๓/๑๑/๒๕๖๘	๑,๒๖๗,๔๕๐.๐๐			๑,๒๖๗,๔๕๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสารี สว่างวงศ์)





แบบขอยืมเงิน GS
สมัครรับเงินช่วยเหลือ



รูปด้าน ๑

1994

◆ **พื้นที่การศึกษามีคุณภาพดีเยี่ยม**

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ

สามารถปรับเปลี่ยนแปลงหนึ่งเท่าที่เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งด้านข้างอาคาร ได้โดยให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 169.93 ตร.ม.

รูปด้าน :

00000000000000000000



แบบแสดงการวาง
โครงกระดูกคน

แบบก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน
ปากช่องระนอง จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรเพ็ญ กิจธนาคุณวัฒน์)
บริษัท รร. มารคอตส์ จำกัด
ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุเมธ นามิอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายณัฐกันต์ หุทธิรักษ์สกุล)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายปิยพงษ์ ประพันธ์ธัญญ์)
วิศวกร รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....อริวัชร.....ผู้ควบคุมงาน
(นายอริวัชร วัฒนาคุณรัมย์)
สถาปนิก(พิเศษ)วิศวกร

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก.....ประธานกรรมการ
(นางเอกา พรหมษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายนำทิลป จิตาภ)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....การรวมการ.....
(นายอวิ ติวิชาภิวัฒน์)

ผู้ชำนาญการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

นางชื่อ.....นางนกรวย

(របាយភិតភ័យ ពុទ្ធារា)

ผู้อำนวยการทํานบบริหารการศึกษา

កងខ្ញុំ.....កន្លែងកន្លែង

(นางศุภกัญญาณ์ คุ้มยิ่ง)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อนุมัติ

१५३०.....

(นายวิชา รุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รูปตัด ก

អរោហ៍

កែតម្រូវថ្នាក់ ៤ ៖ ០.៤០ ៤.៨ ជីវិតកម្មរងរបួស

ໂຕ້ຄວບກາເນາ ເອ.ນ.ພີດທິນຈັງ ທີ່ໄຮ້ທຳກະນາ ມ.ພ.ນິງປັກເນ


การดำเนินงาน : 12-13 กันยายน

STANDARD LIGHT CHANNEL 92, 1015 & 45 HMI 2.3 kW.

ກາງນ້ຳແບ່ງເທິງກັບແມ່ນ້ຳຊຶ່ງລຳ' ຕໍ່ ANGLE RDL? 0.6 ນມ.

รูปตัด ข

รูปตัด ก



ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง



ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุเมธ นามเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ

นางสาว  นันทนา นันทนา

(នាយកដ្ឋាន អនុវត្តន៍)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ស្នាក់នៅ..... ដឹករបបបុរាណ

(นาย) ยะทิพย์ ประจักษ์พจน์

វិភាគវិស័យវប្បធម៌

លេខ..... ថ្ងៃ..... ឆ្នាំ..... ដកបកបក

(นายวิชิต วัฒนาศุภชัย)

ตลาดนัดปฏิบัติ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก..... ประธานกรรมการ

[illegible]

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....กรรมการ.....

(ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន វិញ)

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา-

ס'מ'..... י'ר'ח'מ'ר'נ'ח

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ

0430 000000



นายพิชิตชัย อนุชา

ผัดน้ำมันหอย

0120 *[Signature]* 0111/0111

นายแพทย์อนันต์ วังนันทน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

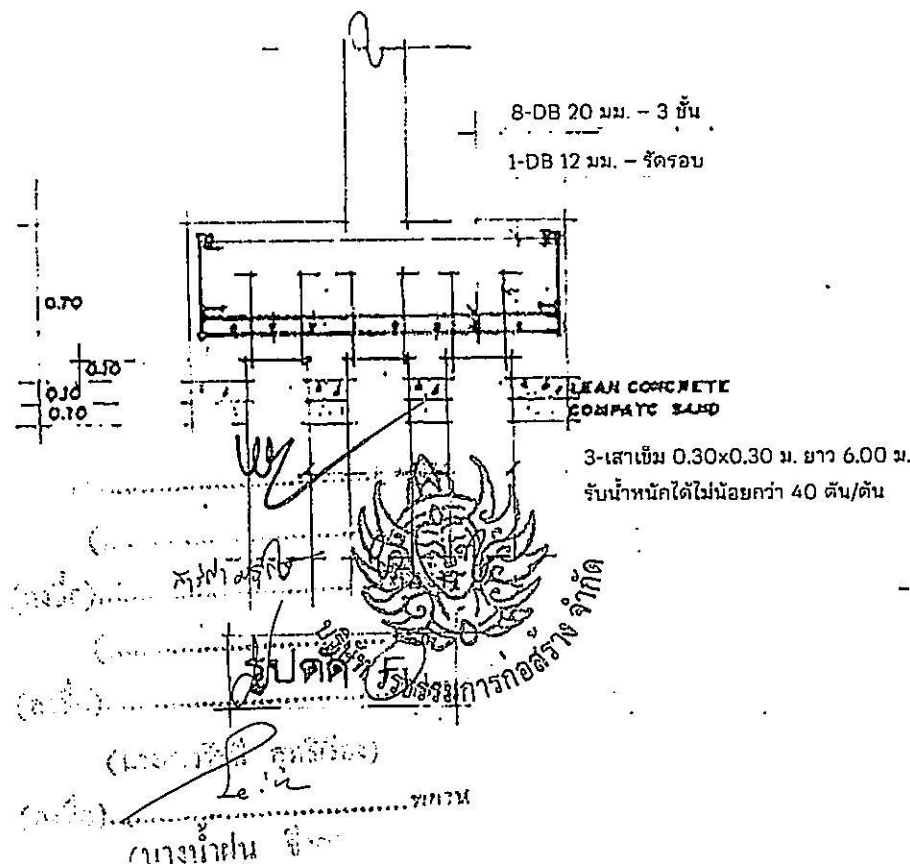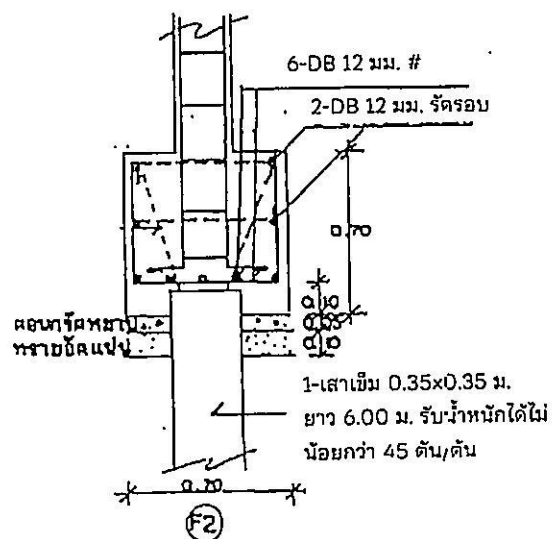

อนุนัต

၈၂၆

(นายวิชากร ช่างเหล็ก)

นายคระกิตติภรณ์ วัฒนจันทน์ วัฒนจันทน์

ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเสี้ยวเข้ม โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ สท. ศท. 4/12 (ปรับปรุง 2545)

วันที่ 24 ธันวาคม 2567

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองไผ่ประชาสรรค์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอกะระโนง จังหวัดขอนแก่น											
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานเดิม			ปริมาณงานใหม่			รวมจำนวนเงิน		หมายเหตุ
			จำนวน	ราคา		จำนวน	ราคา		+ เพิ่ม	- (ลด)	
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ราคา/หน่วย	ราคารวม			
1	งานโครงสร้าง										
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	60.00	7,026.77	421,606.20	-	7,026.77	-	-(421,606.20)		
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35X0.35 ม. ยาว 10.00 ม.	ตัน	3.00	9,609.81	28,829.43	-	9,609.81	-	-(28,829.43)		
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 6.00 ม.	ตัน	-	3,983.32	-	60.00	3,983.32	238,999.20	238,999.20		
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35X0.35 ม. ยาว 6.00 ม.	ตัน	-	5,222.25	-	3.00	5,222.25	15,666.75	15,666.75		
	- ลานคอนกรีต หน้า 0.10 ม.										
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 KSC. (รูปทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	-	3,208.35	-	41.00	3,208.35	131,542.35	131,542.35		
	- หวายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	-	813.15	-	20.50	813.15	16,669.57	16,669.57		
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wire mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.#	ตร.ม.	-	32.41	-	410.00	32.41	13,288.10	13,288.10		
2	งานสถาปัตยกรรม										
2.1	ทาสีกันซึมผนังด้านข้างอาคาร	ตร.ม.	-	151.00	-	-	151.00	25,662.45	25,662.45		
2.2	กระดานดำพร้อมบอร์ด	ชุด	12.00	8,287.64	-	-	8,287.64	-	-(99,451.68)		
2.3	กระดานไวท์บอร์ดพร้อมบอร์ด	ชุด	-	-	-	-	8,056.85	108,682.20	108,682.20		
	รวมเป็นเงิน				435,633.33			441,828.42	623.31		มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
								รวมเป็นงานเพิ่มทั้งหมด	623.31		

(หกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- มูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเงิน 623.31 บาท (ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินค่าก่อสร้างเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น)

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธายานาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายอริวัฒน์ วัฒนาคุ่มน้อย)
สถาปนิกปฏิบัติกร

ผู้รับทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาว ฝน วัฒนาคุ่มน้อย)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายณฐกนต์ พุทธิพิทักษ์กุล)
สถาปนิกยานาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายปิยะพงษ์ ประพันธ์พจน์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นางเจตน์ พรฤณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายนำศิลป์ วิเศษ)
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติชัย อูทรา)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางสุกฤษณ์ ตี๋ยง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
