



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสกนาค - เปื่อยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๕๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๗ ส.ค. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7 ส.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7 ส.ค. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๘๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัทฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสกนาค - เปื่อน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ ที่มีที่ดินติดกับเส้นทางปรับปรุงถนนดินสายดังกล่าว มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินโดยสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งแนวเขตที่ดินได้ปักหมุดตรงบริเวณกึ่งกลางถนนตลอดแนวก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าการแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะสภาพถนนมีความชำรุดทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๘๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๘๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แกไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการในการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสภณาค - เปียนน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสภณาค - เปียนน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๙๗/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายธนบุลย์ ต่วนชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๔๐๐๐๑๙๒๐๐๐๐๒๓๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ชก ๔๐๘๓ (โสกนาค - เปื่อยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน	๕	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน	-	แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนบุลย์ ต่วนชัย)

P
TP (2021) DIGITAL
TP (2021) DIGITAL Co., Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความใน
ภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

TP (2021) DIGITAL Co., Ltd.
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนบุลย์ ต่วนชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาค่างาน

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลู่มะพร้าว แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก 4083 (โสกนาค - เปี้ยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 912 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,085 ลบ.ม. (บดอัดแน่น)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 881/2568 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 493,000 บาท .

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง		ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง		ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม +), (ลด -)		หมายเหตุ
			ราคา ต่อหน่วย	ปริมาณงาน จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ปริมาณงาน จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4.00	7,113.00	28,452.00	7,113.00	28,452.00	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
2	งานผิวจราจรดิน (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	84.50	4,085.00	345,182.50	4,085.00	345,182.50	-	งานและราคา
	ว่าที่ร้อยเอก (ลงชื่อ).....								งาน
	(ลงชื่อ).....								
	รวมเป็นเงิน			373,634.50			373,634.50		
	คำดำเนินการ กำไรและภาษี								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			493,000.00			493,000.00		

(ลงชื่อ)..... พยาน
นางสาววิภา ฤทธิ์เรือ

(ลงชื่อ)..... กรรมการบริษัทฯ
(นายธนบุญ วัฒนชัย)

ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....
(นายสรวิธ อกภัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยา นาทัน)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางอุบลศิริ ไชยแสง)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ).....


(นางสาวกรวรรณ จุ่มอึ้งวะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนดินลูห้ลงเกษตร บ้านป่าบอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอ - ทางหลวงชนบท
ชก 4083 (โลกนาถ - เปือยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

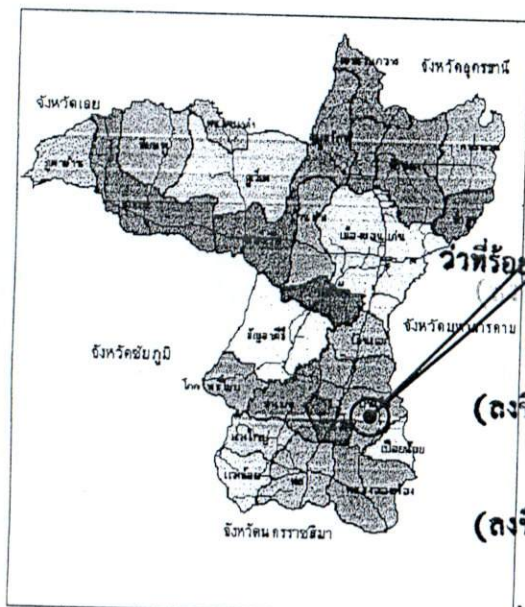

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน (ถนนพหลโยธิน)
ทางหลวงจังหวัด (ถนนพหลโยธิน)
แม้อี, อำเภอ
พหลโยธิน, อำเภอ
หมู่บ้าน
ร. ๕๕๕, ๕๕๕
๕๕๕, ๕๕๕

ตารางระวางแผนที่


5441 I	5441 IV	5541 I
5541 II	5541 III	5541 II
5540 I	5540 IV	5540 I

รายละเอียดที่ดินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่ดินก่อสร้าง จากค่าที่ดินเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 15.906355 องศา ลองจิจูด 102.801914 องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 15.903230 องศา ลองจิจูด 102.809548
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบค่าที่ดินใหม่ ค่าที่ดินใหม่ จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 15.903021 องศา ลองจิจูด 102.809701 องศา จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 15.597595 องศา ลองจิจูด 102.814117

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	นายสุรชัย อภัย	อนุมัติ
ปรับปรุงถนนดินลูห้ลงเกษตร บ้านป่าบอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอ - ทางหลวงชนบท ชก 4083 (โลกนาถ - เปือยน้อย) อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	(นางสาวจรรยา รุ่งเรือง)	(นายวัฒนา ช่างเหลา)
แสดงแบบ	(นางอุบลศิริ ไชยแสง)	
ใบปะหน้า - แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	(นายสุรชัย : นายทับ)	
เลขที่แบบ	(นายอนุชิต คุ้มชัย)	
เลขที่แบบ	(นายอนุชิต คุ้มชัย)	
ว/ค/บ	จำนวน	แบบ

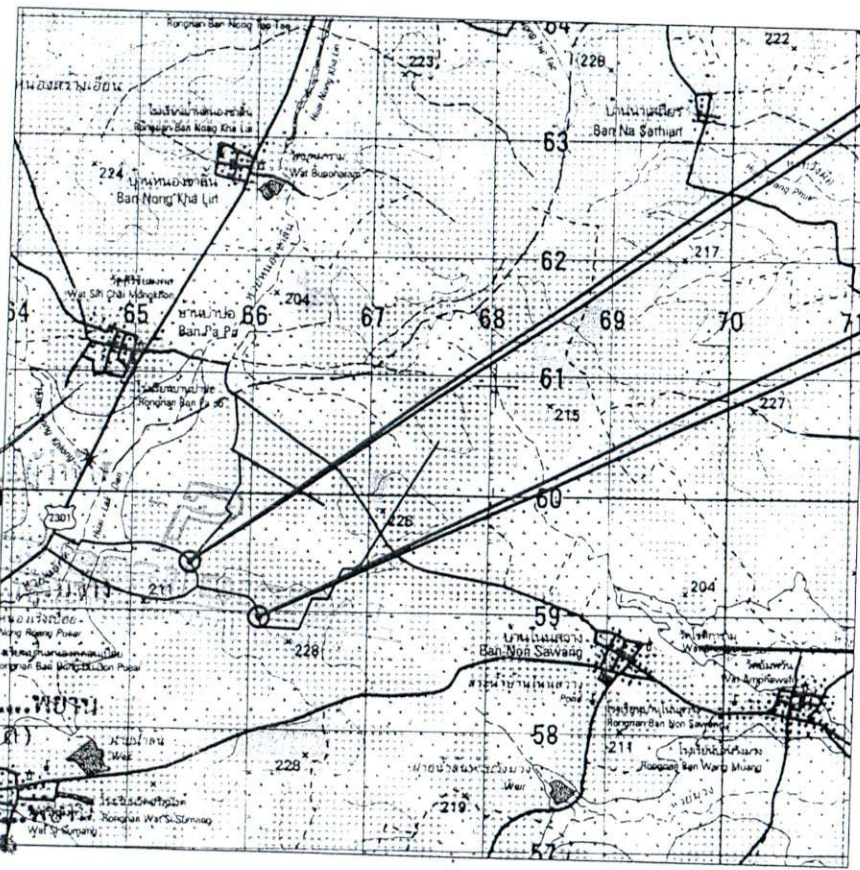

จุดเริ่มต้นโครงการ
ค่าพิกัด
จุดเริ่มต้นโครงการ 15.903021°N
102.809701°E

จุดสิ้นสุดโครงการ
ค่าพิกัด
จุดสิ้นสุดโครงการ 15.597595°
102.814117°E


วาที่ร้อยเอก
จุดที่ตั้งโครงการ
(พงษ์เทพ พรภัก)

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

(ลงชื่อ).....
นางสาวรัชชี่ สุทธิเรือง

ผังแสดงที่ตั้งโครงการ
โครงการ ปรับปรุงถนนดินลู่มะพร้าวแหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท
ชก 4083 (โกลนาค - เปือยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชก 4083 (โลกนาถ - เปื่อยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

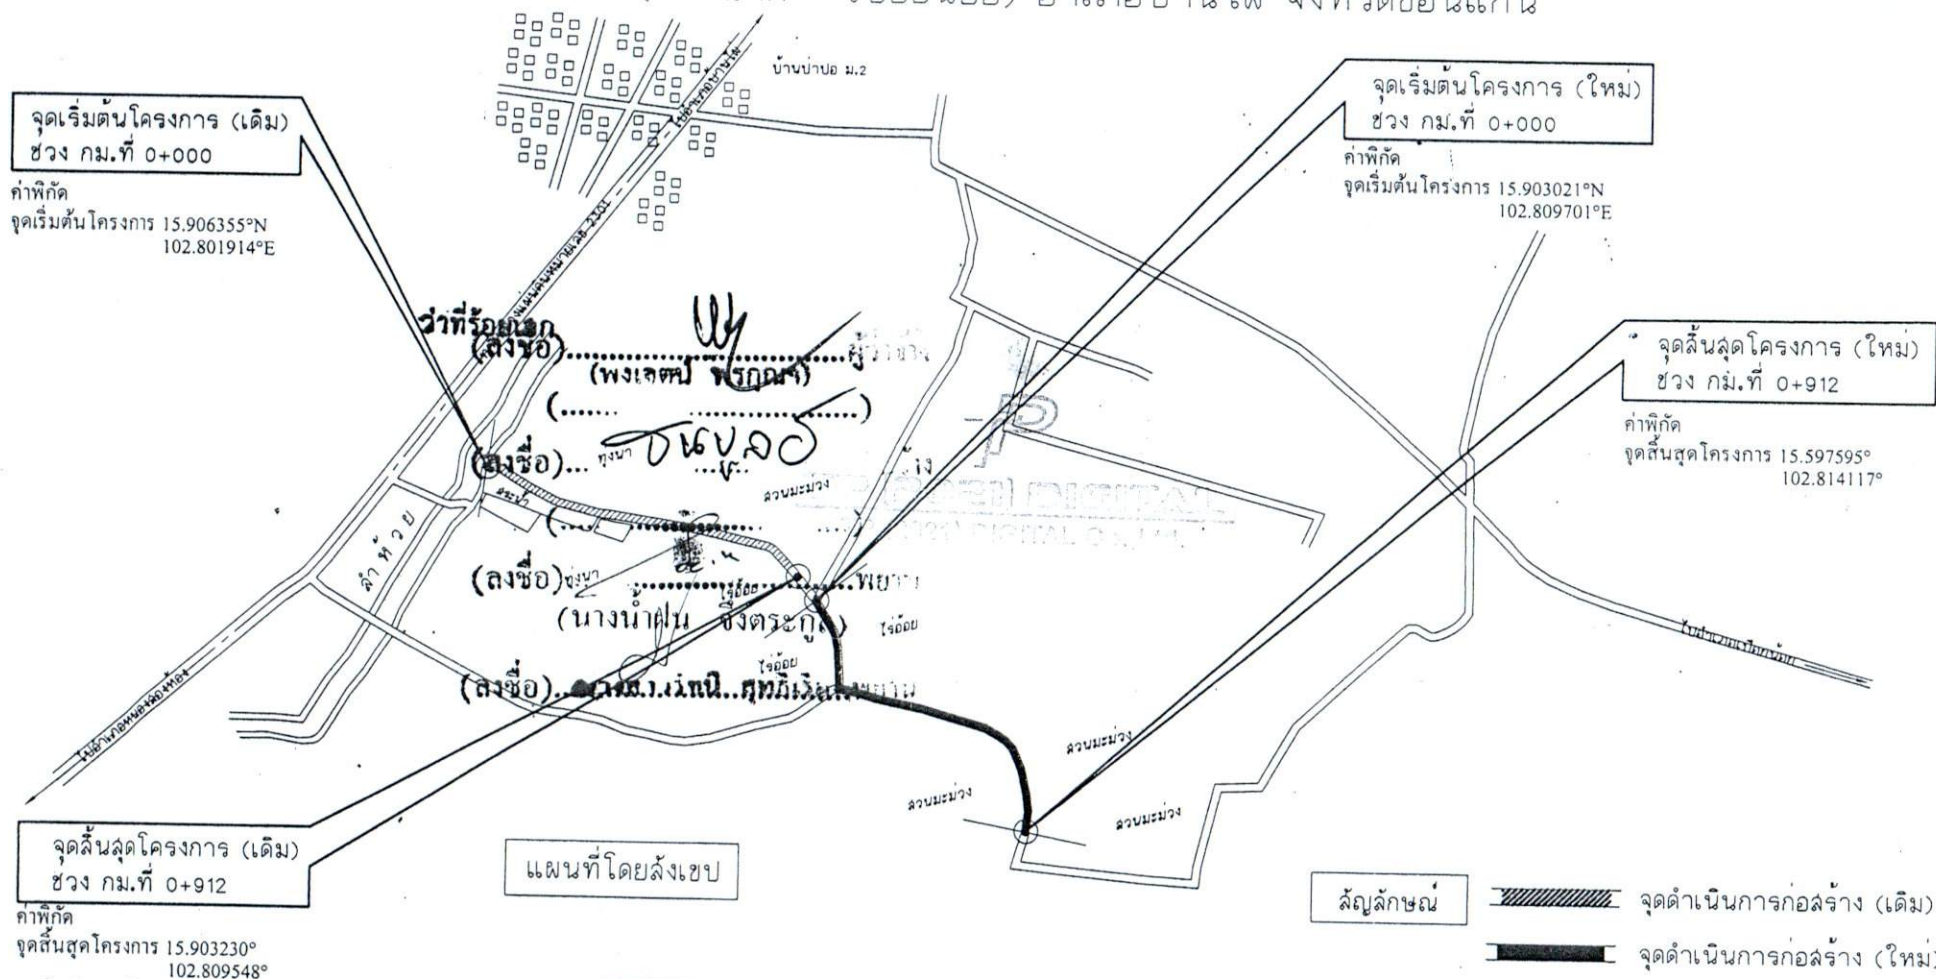

รายละเอียดโครงการ


- ปรับปรุงถนนดินลู่มะเกลือ หน้าบ้านป้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านป้อ - ทางหลวงชนบท ธก 4603 (โลนบก - เปี้ยนน้อย) อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 912 เมตร กบฝังสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,085 ลบ.ม. (ปกติแบบ) จายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่กองการช่างจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- ก่อสร้างอุปโภค และสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อประปา ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตฯ เหล่านี้ก่อนไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุด้านอัคคีภัยในระหว่างดำเนินการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ในการนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการให้รายงานผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการทางจังหวัด โดยทันทีเพื่อรีบดำเนินการ

รายละเอียดที่ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


1. ค่าเงินบาทแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการจากอรัญฯ ซึ่งอยู่ในเส้นทางสายเดียวกับ
สถานีฉวางจากยาวทั้ง 5.00 เมตร ยาว ๑12 เมตร กรมขนส่งเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี
ปริมาณรถดับไม่เกินน้อยกว่า 4,085 ลบ.ม. (ปกติฉบับ)
2. แก้ไขเส้นแบ่งค่าที่หักอรัญฯ รายละเอียดตามแบบที่ส่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


แบบโครงการ		ผู้ทำรายงาน	(นายจุลจกร อภัย) นายก อบจ.จ.ลพบุรี	อนุมัติ
ปรับปรุงจนบัดนี้ดูแลหลังเกษร บ้านป่าบอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอ - ทางหลวงชนบท ถ. 4003 (โคกนา - เปือยน้อย) อำเภอ ป่าบอ จังหวัดขอนแก่น		ประธานกรรมการ	(นางสาวจรรยาพร จุ่มอึ้งวระ) ผู้อำนวยการเขต	
แสดงแบบ		กรรมการ	(นายอุบลศิริ โยธแสง) นายกเทศมนตรีเมือง	(นายวัฒนา ช่างเหลา)
แผนที่โดยสังเขป		กรรมการ	(นายสุริยา นาทัน) นายก อบจ.จ.ลพบุรี	
เลขที่แบบ	แผนที่	ผู้ให้คำแนะนำ	(นายอนุบลย์ ควนชัย) กรรมการเขต	
ว/ด/ป	จำนวน	แผ่น		




STA. 0+200.000
NGL = 101.043




STA. 0+400.000
NGL = 101.919




STA. 0+150.000
NGL = 100.176




STA. 0+350.000
NGL = 101.153




STA. 0+100.000
NGL = 99.302




STA. 0+300.000
NGL = 101.055



STA. 0+050.000
NGL = 98.398



STA. 0+250.000
NGL = 101.162



STA. 0+000.000
NGL = 97.628

BM.



BM. 1 บุนหัวตะปุดนึ่ง ๑ 0.50 ม. STA. 0+113 คาร์ระดับ 100.000 ม.
ทางจาก ๕ 8.20 ม. ซ้ายทาง

รายละเอียดที่ดำเนินการแก้ไข
แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรูปตัดตามขวาง (แก้ไขใหม่)
- ปริมาณดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,085 ลบ.ม. (ตลอดแบบ) (ไม่เปลี่ยนแปลง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ

ปรับปรุงถนนดินลู่น้ำหลังเกษตร บ้านป่าอ
หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ - ทางหลวงชนบท
ชก 4063 (โคกนา - เปือยน้อย) อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แสดงแบบ

แผนที่โดยสังเขป

เลขที่แบบ

ว/ด/ป

แผนที่

จำนวน

แผ่น

ผู้ทำแบบ

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นางสาวกมลวรรณ จันทะวงษ์

ผู้ช่วยนายช่างเทคนิค

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย



นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย

นายสุวิทย์ อภัย


นายสุวิทย์ อภัย

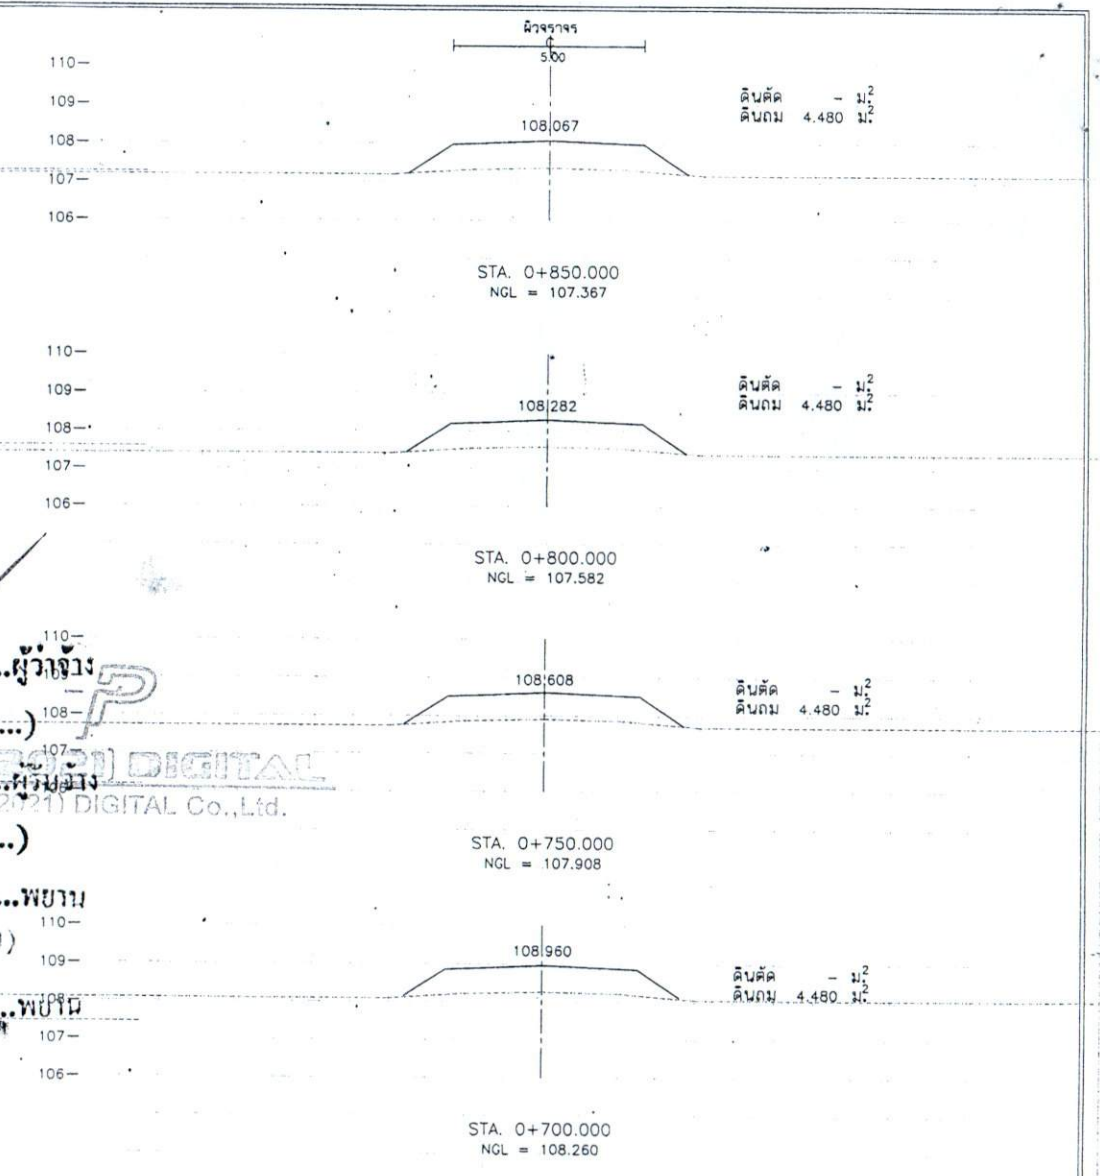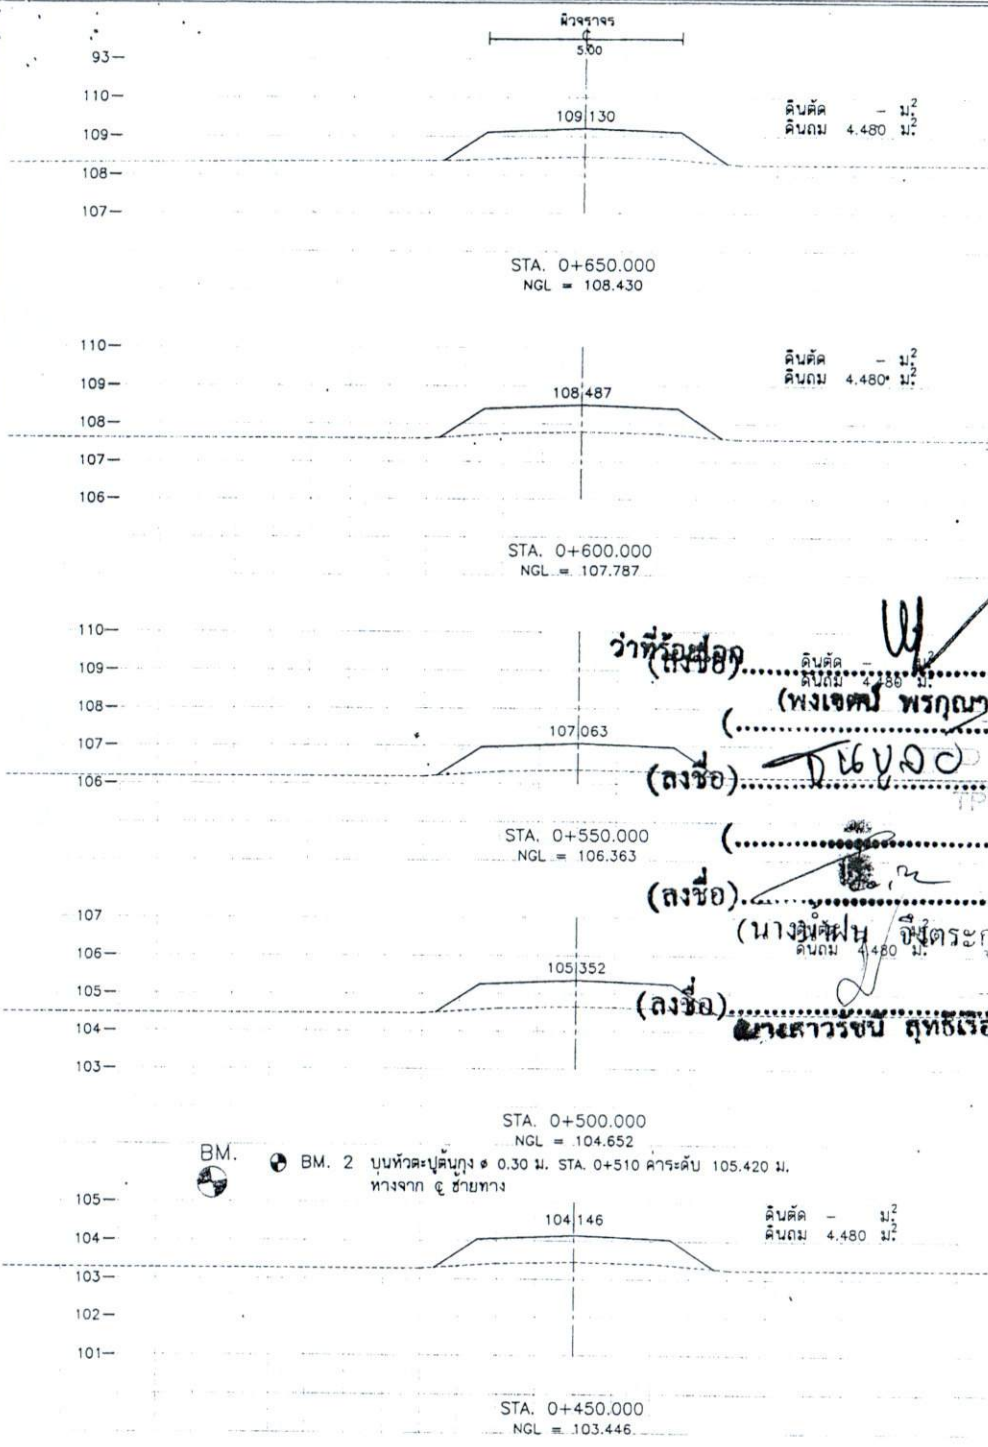


ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นางสาวสุวิมล พงษ์พานิช)
(ลงชื่อ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นางสาวสุวิมล พงษ์พานิช)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุวิมล พงษ์พานิช)
(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสุวิมล พงษ์พานิช)



BM. 2 บนมืด: ปูนสูง ๑ 0.30 ม. STA. 0+510 คาร์ระดับ 105.420 ม.
ห่างจาก ๕ ซ้ายทาง

รายละเอียดที่ดำเนินการแก้ไข แบบบูรณาการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
1. ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าระดับก่อสร้าง รูปตัดตามขวาง (แก้ไขใหม่) 2. ปริมาตรดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,085 ลบ.ม. (บดอัดแบบ) (ไม่เปลี่ยนแปลง)	แบบโครงการ		ผู้แทน 	(นายฉัตร อภัย) นายอำเภอเขาใหญ่	อนุมัติ  (นายวันนา ข้างเหล็ก)
	ปรับปรุงถนนดินลูกรังทางหลวง ข้ามป่าบอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าบอ - ทางหลวงชนบท ถก 4083 (โลกบาล - เปือยบอ) อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		ประธานสภา 	(นางสาวจรรยาพร รุ่งเรือง) ผู้อำนวยการกองคลัง	
	แล้วคนแบบ		กรรมการ 	(นางอุบลศิริ ไชยแสง) นักบริหารงานทั่วไประดับ ชำนาญการ	
	แผนที่โดยสังเขป		กรรมการ	(นายสุริยา นาทัน) นักบริหารงานช่างระดับ ชำนาญการ	
	เลขที่แบบ		แผนที่	ผู้แทนสภาผู้แทน 	
ว/ด/ป	จำนวน	ฉบับ	ฉบับจริง		

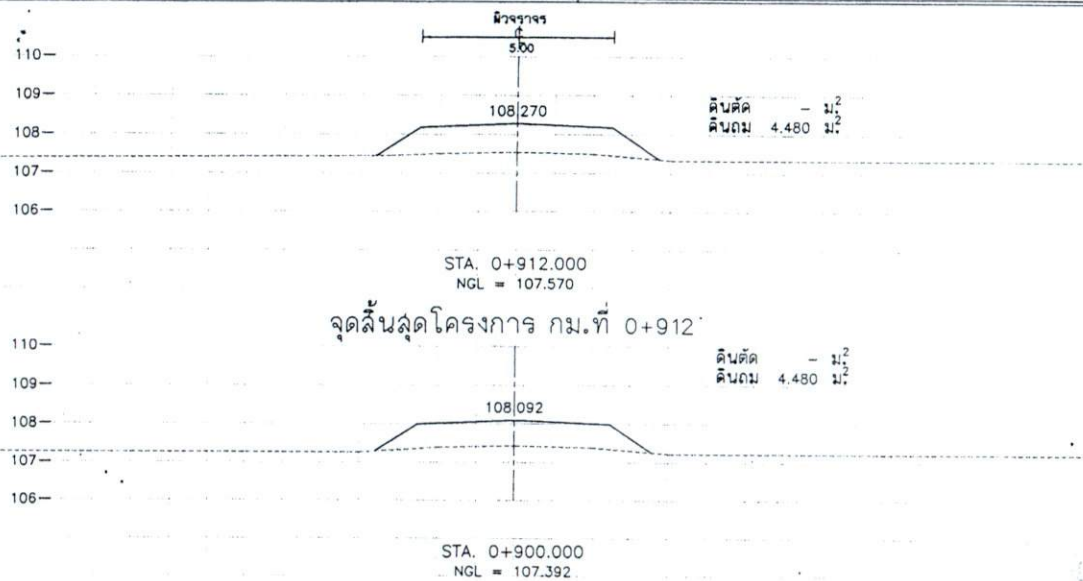

ว่าที่ร้อยเอก
(ลงชื่อ).....

(พงเขตน์ พรภณ)

(ลงชื่อ).....

อเนก

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นางน่าน ใจตระกูล)

(ลงชื่อ).....

พยาน
(นายวิวัฒน์ ช่างเหล็ก)

รายละเอียดที่ดำเนินการแก้ไข แบบรูปรายการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
1. ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าระดับก่อสร้าง รูปตัดตามขวาง (แก้ไขใหม่) 2. ปริมาตรดินถมสูงเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมไม่ต่ำกว่า 4,085 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) (ไม่เปลี่ยนแปลง)	แบบโครงการ	ผู้ควบคุมงาน	(นายวิวัฒน์ ช่างเหล็ก)	อนุมัติ (นายวิวัฒน์ ช่างเหล็ก)	
	ปรับปรุงถนนลูกรังหลุมบ่อชำรุด บำบัด หมู่ที่ 2 ตำบลป่าอ้อ - ทางหลวงชนบท ชก 4083 (โคกบาค - เปือยน้อย) อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	นายอำเภอ	(นายวิวัฒน์ ช่างเหล็ก)		
	แสดงแบบ	กรรมการ	(นางสาวกมลวรรณ จันทะวงษ์)		
	แผนที่โดยสังเขป	กรรมการ	(นางอุบลศิริ ไชยแสง)		
	เลขที่แบบ	แบบที่	(นายสุริยา นาทัน)		
ว/ด/ป	จำนวน	แบบ	(นายอนุชิต คำวนิชย์)	กรรมการ	



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๐๐๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีที (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสกนาค - เปื่อยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ที่มีที่ดินติดกับเส้นทางปรับปรุงถนนดินสายดังกล่าว มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินโดยสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งแนวเขตที่ดินได้ปักหมุดตรงบริเวณกึ่งกลางถนนตลอดแนวก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะสภาพถนนมีความชำรุดทรุดโทรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสกนาถ - เปือยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๘๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ ที่มีที่ดินติดกับเส้นทางปรับปรุงถนนดินสายดังกล่าว มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินโดยสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งแนวเขตที่ดินได้ปักหมุดตรงบริเวณกึ่งกลางถนนตลอดแนวก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๕๙๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

/- ๔. การขอแก้ไข...

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร บ้านป่าปอ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าปอ - ทางหลวงชนบท ขก ๔๐๘๓ (โสกนาถ - เปี้ยน้อย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๐๖๓๕๕ องศา N, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๑๙๑๔ องศา E
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๙๑๒ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๐๓๒๓๐ องศา N, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๙๕๔๘ องศา E

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๐๓๐๒๑ องศา N, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๐๙๗๐๑ องศา E
จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๙๑๒ พิกัด ละติจูด ๑๕.๕๙๗๕๕๕ องศา N, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๑๔๑๑๗ องศา E (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๕๙๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสืออ้าง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้อ้าง ฯ หักงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่ สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมี หลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

/- ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๕ วัน
๓. แจ้งบริษัท ทีพี (๒๐๒๑) ดิจิตอล จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
6 ส.ค. 68

เพื่อโปรดลงนาม
= 6 ส.ค. 2568

อนุมัติ

(นางสาวพัชรินทร์ อัมจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
6 ส.ค. 68

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6 ส.ค. 2568

(นางอาชีষะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
6 ส.ค. 2568
