



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๒๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

1 ก.ย. 68

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

1 ก.ย. 68

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1 ก.ย. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1 ก.ย. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๒๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอยกเลิกทำการก่อสร้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอยกเลิกงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๓ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๒๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๒๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น -
ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน
ค่าจ้าง ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑๖ หมู่ ๙ ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายทองคุณ ไชยพิมพ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม.๐๐๐๘๘๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....	จำนวน ๓ แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..	จำนวน ๑ แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....	จำนวน - แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....




ห้างหุ้นส่วนจำกัด
จิราพร ก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง

(นายทองคุณ ไชยพิมพ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความ
ในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..... **ห้ามหุ้นส่วนจำกัด**
วิธานรับจ้างก่อสร้าง
(นายทองคุณ ไชยพิมพ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฉาบปูนอุดตอ									
	1.1 งานฉาบปูนอุดตอขนาดเบา	800.00	ตร.ม.	2.00	1,600.00	800.00	ตร.ม.	2.00	1,600.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต									
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	40.00	ลบ.ม.	650.00	26,000.00	40.00	ลบ.ม.	650.00	26,000.00	
3	งานผิวทาง									
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	800.00	ตร.ม.	395.00	316,000.00	800.00	ตร.ม.	395.00	316,000.00	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	15.00	ม.	240.00	3,600.00	15.00	ม.	240.00	3,600.00	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	65.00	ม.	135.00	8,775.00	65.00	ม.	135.00	8,775.00	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	165.00	ม.	52.00	8,580.00	165.00	ม.	52.00	8,580.00	
4	งานไหล่ทาง									
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลียวรับน้ำ	25.00	ลบ.ม.	160.00	4,000.00	25.00	ลบ.ม.	160.00	4,000.00	
5	งานป้ายชื่อโครงการ									
	5.1 งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	(ลงชื่อ).....			371,555.00				371,555.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี	(ลงชื่อ).....			118,445.00				118,445.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)				490,000.00			ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)	490,000.00	
	ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)								490,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)								490,000.00	
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)								-	
	คิดเพียง								-	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรพล หิรัญนคระห์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติชัย อุทธา)

ทางโยธาจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด

โดยไม่เรียกหรือค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญชนะ อาจจำนงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นางหุ่นส่วนจำกัด
จรัสพร ก่อสร้าง



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายทองคุณ ไชยพิมพ์)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสูง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

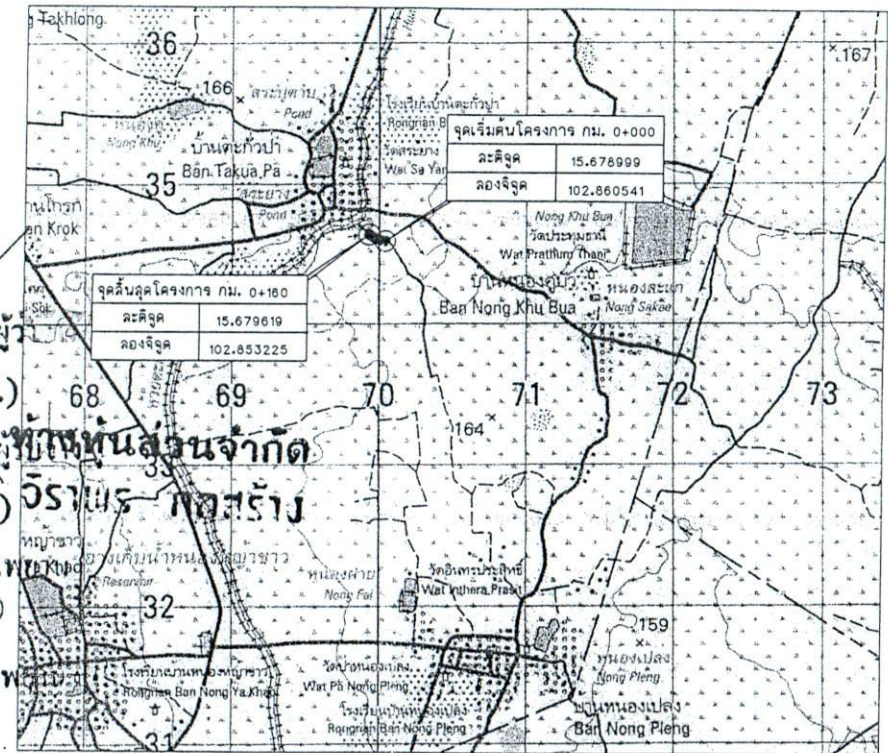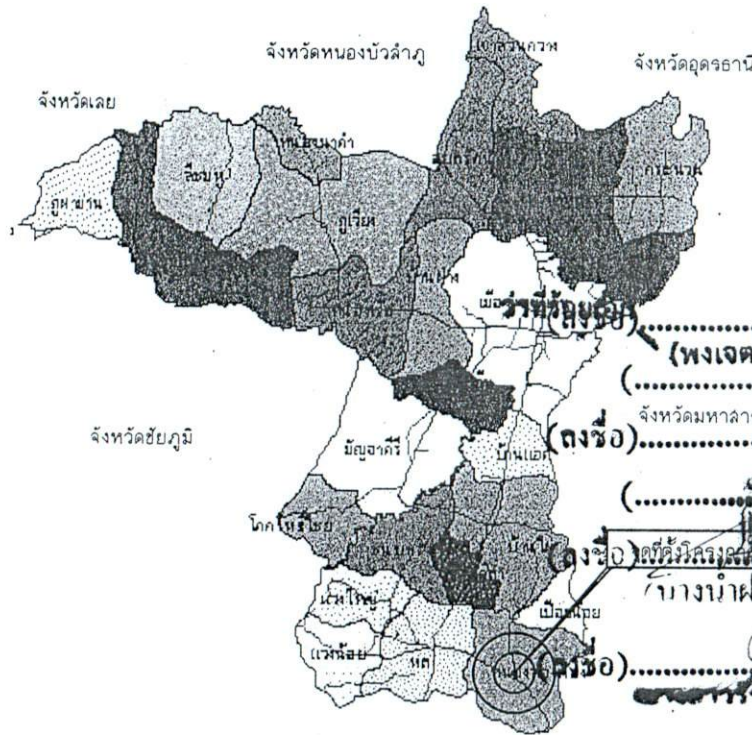

จะวางแผนที่ 5540 II

สัญลักษณ์



ทางหลวงแผ่นดิน กรมการขนส่ง
ทางหลวง ๑ ทางหลวงพิเศษ กรมการขนส่ง
แม่น้ำ, ลำคลอง
หนอง, ห้วย
ชุมชน
ด. อุทก, ไร่สวน
ฝาย, เขื่อน, อ่าง

จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับเลขวางแผนที่

5540 IV	5540 I	5640 IV
5540 III	5540 II	5640 III
5539 IV	5539 I	5639 IV

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสูง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ แผนผัง แผนที่จังหวัด เลขที่แบบ.....	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายสุรพล หิรัญรัมย์) เจ้าพนักงานที่ดิน อำเภอหนองสูง	ประธานกรรมการ (นายกิตติชัย อุทอา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา กรรมการ (นายอนุพงษ์ หิรัญรัมย์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น กรรมการ (นายบัณฑิต ฉางจันท)
--	--	--

ลํารับัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	จำนวนแผ่น
แบบที่จังหวัด	1
ลํารับัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณสิ่งปลูกสร้าง	3
แบบมาตรฐาน	4 - 7


รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพื้นทางเดิม (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	อบจ.2-202
แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	อบจ.2-203
แบบมาตรฐานแบบป้ายชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
แบบมาตรฐานแบบป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

มาตรฐานการเสริมหรือสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)
1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับ หรือทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างที่โครงการก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแนบการปฏิบัติงานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้แบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติใช้ในงานก่อสร้างนั้นๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานที่กำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือประชาชน
4. ค่าแรงของหมวดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (อ.ม.) เป็นค่าแรงสัมบูรณ์ที่อิงหาในการก่อสร้างเท่านั้น
5. รอยต่อวัสดุรวมทั้งเครื่องและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้จ้าง
7. มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
8. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้ปรับระดับถนนให้เรียบกับถนนเดิม โดยไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9. ลายารูปแบบ และลายารูปแบบการวาง เช่น ไฟฟ้าโทรศัพท.ประปา และท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและแบบแปลนโครงการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ถ้ามีสิ่งต่างๆ ให้เป็นอุปสรรค
10. ท่อ คลอด ให้ใช้มีความยาวตามมาตรฐานที่ผลิต โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11. ให้เตรียมดิน และ/หรือ ท้องถนนเดิมบริเวณปลายท่อที่เสร็จแล้ว เพื่อให้สามารถระบายน้ำผ่านท่อได้
12. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในรายละเอียดหรือแสดงไว้ชัดเจน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่มีเป็นปัญหาก็ให้ช่างที่ผู้จ้างงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบตัดสิน
13. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้าง รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย หรือผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
14. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	งานวางท่อ	ตร.ม.	800.00	
2.	งานขุดลอกและถมดิน	ลบ.ม.	40.00	
3.	งานผิวทาง	ตร.ม.	800.00	
3.1	งานผิวทางบดอัดแบบคอนกรีต พหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	85.00	
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	155.00	
4.	งานโหลทาง	ลบ.ม.	25.00	
5.	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลกะทิงบัว อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลน้ำค อำเภอโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์	ช่างผู้ควบคุมงาน (นายสุรพล ภูมิบุญเคาะจาท) ผู้รับจ้าง	ประธานกรรมการ (นายกิตติชัย อุทอา) ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา (นายอนันต์ พันธ์ทอง) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
ผู้ควบคุมงาน ลํารับัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	นางพันธุณี ภูมิบุญเคาะจาท ผู้รับจ้าง	กรรมการ (นายอนุชิต ภูมิบุญเคาะจาท)
เลขที่แบบ.....	แผ่นที่.....	กรรมการ (นายอนุชิต ภูมิบุญเคาะจาท)

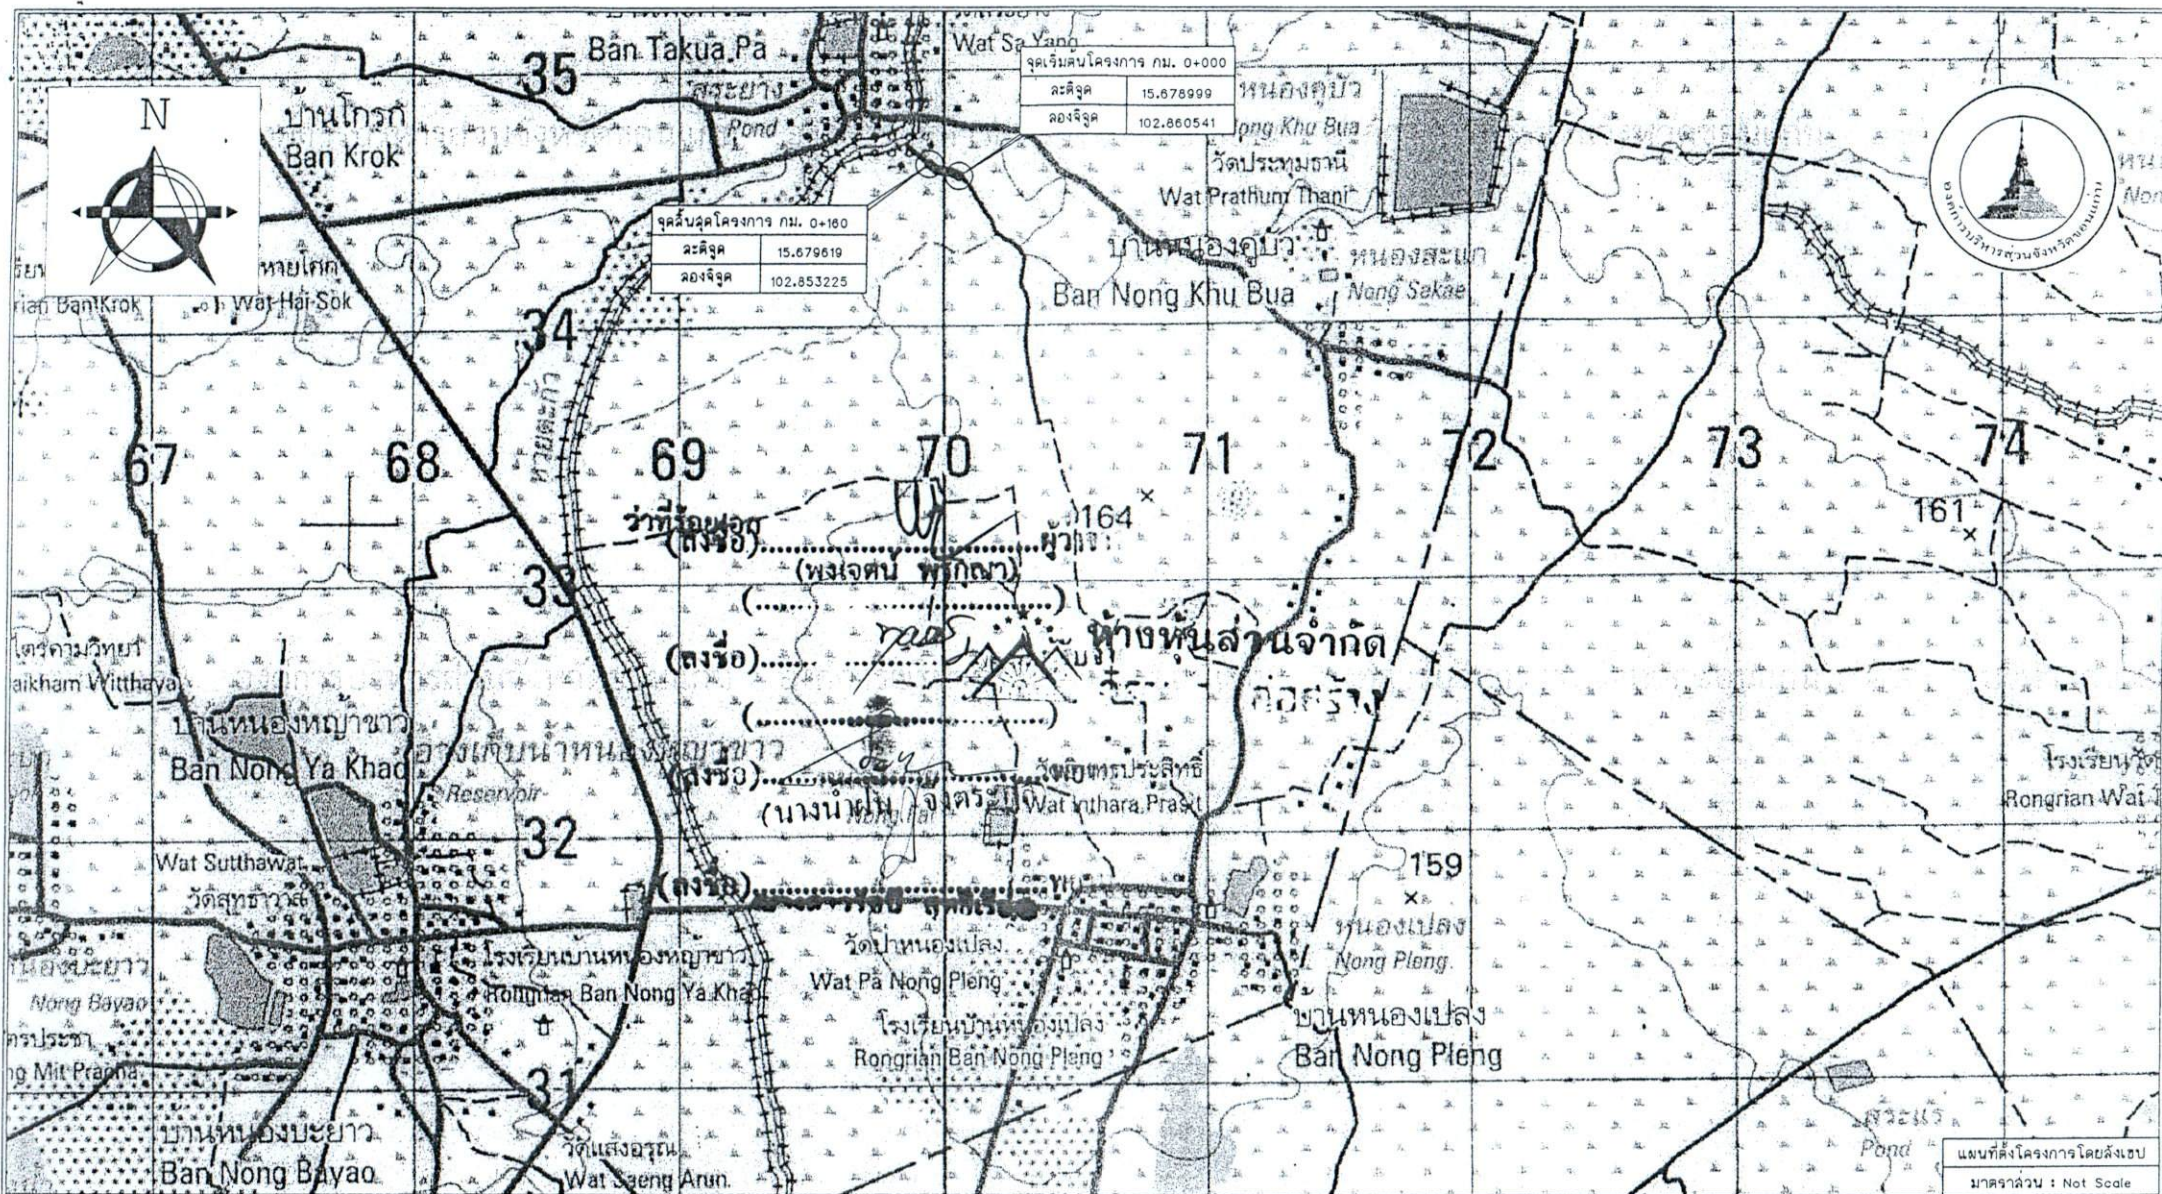

รายละเอียดโครงการ	
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทอง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านบุ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ	
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	
2. ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมการเช่า เช่น โฉนดที่ดิน, โฉนดที่ดิน, ประปา, เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง	
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกไป ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง	
3. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่กระทำ	
หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัย	
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด	
4. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	ฝ่ายผู้ควบคุมงาน	ประธานกรรมการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		(นายศักดิ์ชัย อุทอา)	
ลาดบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า		ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	
อำเภอนาทอง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านบุ	(นายจุฬพล หิรัญเดชะ)	กรรมการ	
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์	นายช่างโครงการ	(นายอนุพงศ์ เทียรทอง)	
ผู้ควบคุมงาน	นายช่างโครงการ	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	
แบบผังบริเวณผัง	นายช่างโครงการ	กรรมการ	
แผนที่แนบ	นายช่างโครงการ	(นายบุญชนะ อาจจำนงค์)	
เลขที่แบบ.....	แผนที่.....		



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๑๑๒๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงานโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งห้าง ฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณานุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือทาง ฯ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ทาง ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ทาง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๗๖๑๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปล่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๓๓๓๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๕๐๗๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๒๕ องศา

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๓๘๘๙๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๓๙๖๑๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๕๓๒๒๕ องศา (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปรายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือข้าง ๖ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ข้าง ๖ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิซึ่งลดลดค่าปรับจำนวน ๘๓ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๘๓ วัน
๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิตระกุล)
เจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดลงนาม
29 เม.ย. 2568



(นางพิมพ์วิณีย์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๙ ส.ค. ๖๘



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๙ ส.ค. ๖๘



(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
29 ส.ค. 2568

อนุมัติ



ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พงกุนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
29 ส.ค. 2568




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร ๐-๔๓๓๐-๖๑๔๗
ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/ ๖๗๐/๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมเวลา ๙๐ วัน จำนวน ๑ งวดงาน

สำนักงาน ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (รายละเอียดตามสำเนา บันทึกแนบท้าย) และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- สำนักงาน แจ้งการแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สัญญาเลขที่ 943/2568 ลว. 16 พฤษภาคม 2568

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นความชอบงานบริหาร สัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิลลักษณ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

28 ส.ค. 68

(นางสาวจิรัชญา ไผ่ตรีจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๘ ๘๐/๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๔๓๓๐-๔๑๔๖ ต่อ ๑๕

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๕๕๘

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาแก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้างและการงดหรือลดค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๐๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓. ผู้ควบคุมงานได้ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าวโดยตลอด แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนด

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายกิตติชัย อุตธา	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญชนะ อาจจำนงค์	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น	กรรมการ
๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
๔. นายสุรพล หิรัญนคระห์	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน

ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานโครงการดังกล่าว โดยแจ้งว่าห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ดังกล่าวได้ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าวแล้วและไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปารายการที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ดังกล่าวได้ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าวจริง

จึงมีมติควรแก้ไขแบบรูปารายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อก่อสร้างถนนในส่วนที่มีความที่ประชาชนยินยอม ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งเหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแก้ไขแบบรูปารายการก่อสร้าง โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการก่อสร้างใหม่ ดังนี้

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตามสัญญา ๙๐ วัน

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๓๗๓๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๕๐๗๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๒๕ องศา

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการใหม่

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๘๙๙๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๙๖๑๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๕๓๒๒๕ องศา

(รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปารายการใหม่)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานเท่าเดิม วงเงินตามสัญญาเท่าเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) โดยขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและเสนอให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสิ่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอน งานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบ ๆ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้แก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการใหม่ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตามสัญญา ๙๐ วัน

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๓๗๓๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๕๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๕๐๗๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๒๕ องศา

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการใหม่

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๘๙๙๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๕๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๙๖๑๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๕๓๒๒๕ องศา

(รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปารายการใหม่)

๒. พิจารณาดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่

๓. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่เสนอมาพร้อมนี้


(นายสุริยา นันทน)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
๑๑ ก.ค. ๖๘

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติชัย อูธธา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายบุญชนะ อาจจันงค์)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรพล หิรัญนคระห์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ชอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)


(นายกี ศรีชาติวปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายสมดิว น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๔๓๓๐-๖๑๔๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/พิเศษ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแก้ไขแบบรูปรายการ กรณีผู้รับจ้างขอหยุดงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๐๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง ๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

๓. ผู้ควบคุมงานได้ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าวโดยตลอด แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนด

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายกิตติชัย อุทธา	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญชนะ อาจจำนงค์	นักบริหารงานทั่วไประดับต้น	กรรมการ
๓. นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง	นักบริหารงานช่างระดับต้น	กรรมการ
๔. นายสุรพล ทิรัญนุเคราะห์	นายช่างโยธาอาวุโส	ผู้ควบคุมงาน

ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราพร ก่อสร้าง มีหนังสือแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานโครงการดังกล่าว โดยแจ้งว่าห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ดังกล่าวได้ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าวแล้วและไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ปรากฏว่าสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ ดังกล่าวได้ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในช่วงดังกล่าวจริง

จึงมีมติควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อก่อสร้างถนนในส่วนที่มีความที่ประชาชนยินยอม ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งเหตุดังกล่าวถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๓. ข้าราชการผู้ควบคุมงาน ได้เสนอแนะการแก้ไข แบบรูปรายการก่อสร้าง

โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อก่อสร้างถนนในส่วนที่ประชาชนยินยอม ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และเหตุแห่งการแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้างดังกล่าว ถือเป็นเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานรัฐหรือเหตุอันเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการดังนี้

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเป่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอนาทมสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ราคาค่าก่อสร้าง ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาตามสัญญา ๙๐ วัน

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๓๗๓๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๕๕๐๗๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๒๕ องศา

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งโครงการใหม่

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๘๙๙๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๖๐๕๔๑ องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.๐+๑๖๐ พิกัด ละติจูด ๑๕.๖๗๙๖๑๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๘๕๓๒๒๕ องศา

(รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปรายการใหม่)

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเข้าร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการก่อสร้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล หิรัญนุเคราะห์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

ทราบ

นัดคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการส่วนฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติชัย อุทธา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญชนะ อาจจำนงค์)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
