

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๒๖,๓๖๘.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่

ลงนามแล้ว

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๑๙ ก.ย. ๖๘

(นางสาวพัชรีณัฏฐ์ ยิ้มจู)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๙ ก.ย. ๖๘

ว่าที่ร้อยเอก

(พจนเจตน์ พรภุณา)

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.ย. 2568

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.ย. 2568



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๑๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบลีสตางค์) เนื่องจากมีในช่วงพิกัดละติจูด ๑๖.๗๗๕๙๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๕๗๓๐ ถึง ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๕๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๓๗๑๒ เป็นพื้นที่ของราษฎร จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ ที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๘ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๑๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๐๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๒๖,๓๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ ๔ ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยธิดา บุญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๐๑๖๕๕๐ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยธิดา บุญญา)



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓,๔๘๕.๙๘ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๘๓๓.๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๙๗.๕๐ - บาท (แปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปัทมา บุญญา)



แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วันละ ๕๐๖.๘๔ บาท (ห้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยธิดา



(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จิตรตระกูล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบเดิม ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมปรับมาตรฐานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

เขตตม.บ. ๑๐๐ เมตร ทนน้ำเค็ม ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินโคลนไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เก็ลลีย์เรียบ)

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	คำอธิบายการ + กำไร + ภาษี	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ตามแบบเดิม		ตามแบบก่อสร้าง		เปรียบเทียบ		หมายเหตุ
					ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงินปรับ ลดค่างาน (บาท)	
๑	งานวางपादท่อ ขนาดเบ	ตร.ม.	๑๕๕๕.๖๐๖๒๔๑	๒๑,๙๙๖.๙๔	๕,๒๘๐.๐๐	๑๓,๙๙๒.๘๐	-	๓,๐๘๐.๐๐	-	๘,๑๐๔.๑๔	
๒	งานฉาบฉาจรานหินคลก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	๑๕๕๕.๖๐๖๒๔๑	๓๓๗,๐๐๓.๐๖	๕๐๔.๐๐	๒๑๒,๘๔๔.๐๔	-	๒๙๔.๐๐	-	๑๒๔,๑๕๙.๐๒	
			(ลงชื่อ).....								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			๙๔๙,๐๐๐.๐๐		๒๒๖,๗๒๖.๘๔	-			-	๑๓๒,๒๖๓.๑๖

หมายเหตุนี้
ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ (เจ็ด) เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๒๖๓.๑๖ บาท
ผู้รับจ้างยินยิตรับค่างานน้อยกว่าสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๒๖๓.๑๖ บาท

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ ภูมิบุตร) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ ภูมิบุตร) กรรมการ



นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ชำนาญการส่วนบุคคล



นางสาว ๗ กรมการ

(นายสุริยา นาทัน)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

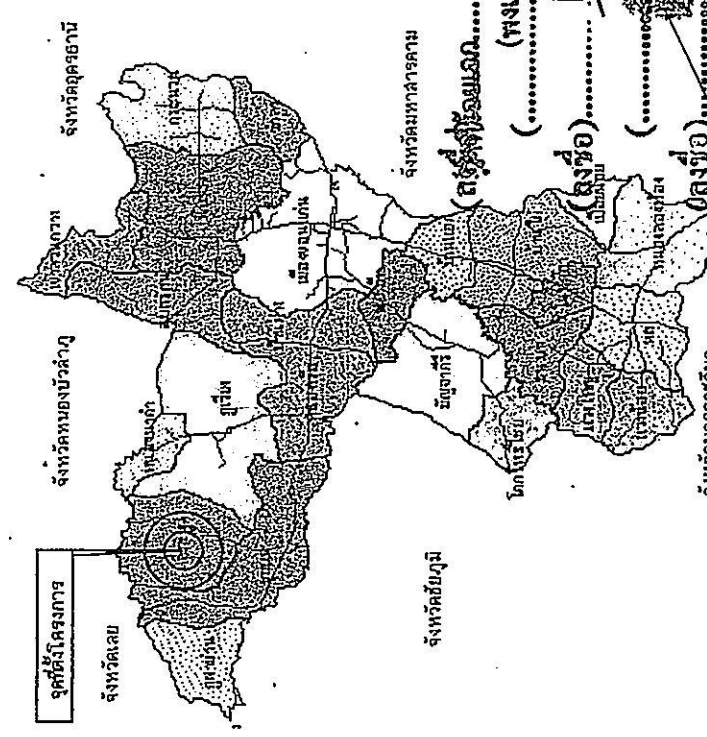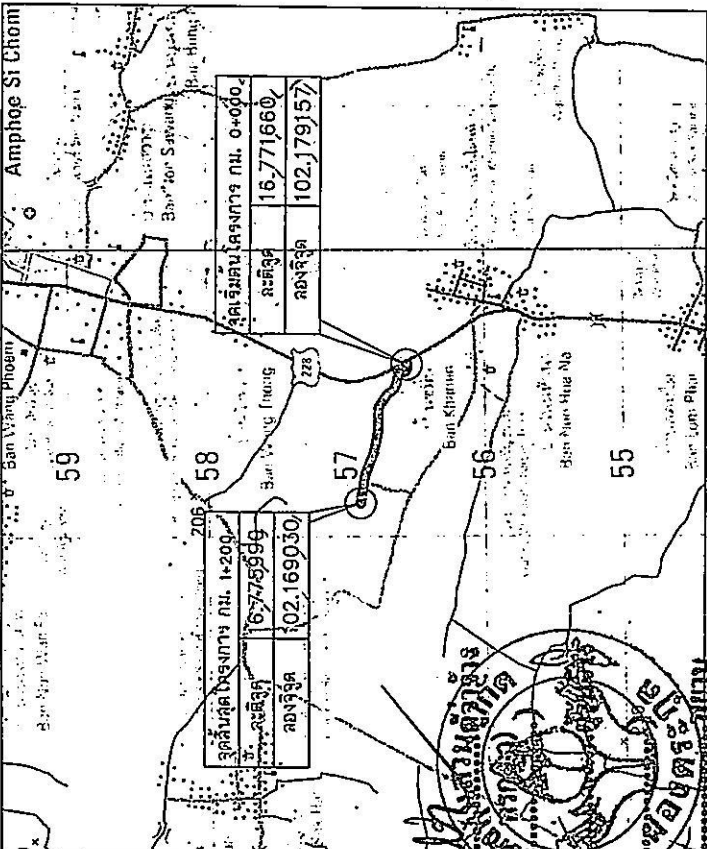

ระวางแผนที่ 5442 IV

(นางนันทน์ จันทร์กุล)

(ลงชื่อ).....

5442 I	5442 IV	5442 VI
5442 II	5442 V	5442 VII
5442 III	5442 VIII	5442 IX

เทศบาลเมือง ขอนแก่น
พิกัด : UTM
หน่วย : เมตร
Datum : WGS 84
Projection : UTM
Zone : 48 N

โครงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
โครงการ	บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด	โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ	1,000,000,000 บาท
ผู้รับผิดชอบ	นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ควบคุมงาน	นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ตรวจสอบ	นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ดำเนินการ	นายสมศักดิ์ จังตระกุล

(ลงชื่อ)..... (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)..... (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)..... (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)..... (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
(ลงชื่อ)..... (นายสมศักดิ์ จังตระกุล) กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา
มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๑๓๒,๒๖๓.๑๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบหกสตางค์)
รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน
๒๒๖,๓๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

งวด เงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๒๘/๐๗/๒๕๖๘	๒๒๖,๓๓๖.๘๔			๒๒๖,๓๓๖.๘๔

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุมมา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาว.....)

ผู้รับจ้าง





ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๔๐๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๗๘๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่
๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เนื่องจากในช่วงพิกัดละติจูด ๑๖.๗๗๕๙๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๗๓๐ ถึง
ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๘๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๘๗๑๒ เป็นพื้นที่ของราษฎร จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม.
(เฉลี่ยเรียบ) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะ
แก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งห้างฯ ได้ทราบ
รายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
แก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๑๓๒,๒๖๓.๑๖ บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบหกสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน
๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญา
จ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากในช่วงพิกัดละติจูด ๑๖.๗๗๕๙๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๗๓๐ ถึง ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๙๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๗๑๒ เป็นพื้นที่ของราษฎร จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เก็ลยเรียบ) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงต้องแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหมื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐ , ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗
จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๑+๙๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๙๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๓๗๑๒

แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหมื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)

จุดเริ่มต้นโครงการกม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐,ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗ จุด สิ้น สุด โครงการ กม ๑+๒๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๕๕๙๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๐๓๐ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปรายการใหม่)

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดิมและอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๑๓๒,๒๖๓.๑๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบหกสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทาง ห้างฯ ยินยอมให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือห้าง ฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห้าง ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๘ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/(๓) เป็นการแก้ไข...

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๒๖,๓๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบลีสดังกล่าว)
๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๘๘ วัน
๓. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตรตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
18 ก.ย. 68

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

18 ก.ย. 68

(นางอาชีวะ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ย. 2568

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ย. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๕๓๓๐-๖๑๙๗

ที่ ขก ๕๑๐๐๕๕/๗๒๗/๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เป็นผู้รับจ้างใน วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๕๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งดงาน ๑ งดงาน

สำนักช่าง ได้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าวแล้ว เห็นควรดำเนินการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมณวิธ น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- สำนักช่าง แจ้งการแก้ไขแบบบูรณาการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สัญญาเลขที่ 867/2568 ลว. 29 เมษายน 2568

- เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบงานบริหารสัญญาดำเนินการต่อไป

(นางสาวมนัสลักษณ์ สะตะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

5 ก.ย. 68

(นางสาวจิรัชญา ไมตรีจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ อิ่มจู

(นางสาวพัชรินทร์ อิ่มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

5 ก.ย. 68



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ

ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๒๒๙๖

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการงานก่อสร้างแก้ไขแบบรูปารายการ กรณีผู้รับจ้างหยุดงาน
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมภู จังหวัด
ขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น-หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมภู จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล เป็นผู้รับจ้างในวงเงินค่าก่อสร้าง ๓๕๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๐ วัน งบประมาณ ๑ งบดงาน

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล ได้แจ้งเข้าดำเนินการโครงการฯ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องตระกูล มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรค และขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญา โดยแจ้งว่าสถานที่ปรับปรุงถนนหินคลุก พื้นที่บางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเร่งรัดและแก้ไขสัญญาดังกล่าว โดยทาง หจก.ฯ ยินดีปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้ และพิจารณาสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงถนนหินคลุกให้กับทางหจก.ฯ

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับหนังสือแจ้ง ปรากฏว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ เนื่องจากในช่วงพิกัดละติจูด ๑๖.๗๗๕๕๖๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๗๓๐ ถึง ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๙๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๓๗๑๒ เป็นพื้นที่ของราษฎร จึงมีพื้นที่ปรับปรุงถนนหินคลุกได้เพียง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ประชุมพิจารณาการ โดยได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ว่าได้เข้าตรวจสอบพื้นที่จริง จึงมีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงาน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแก้ไขแบบรูปารายการให้แล้วเสร็จ

/ข้อเท็จจริง...

19/90

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข่างผู้ควบคุมงาน พิจารณาแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงาน ลดวงเงินตามสัญญาจ้าง และเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการ ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐ , ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗
จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๑+๙๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๙๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๓๗๑๒

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมพ จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบลีสตางค์)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐ , ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗
จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๑+๒๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๕๙๙๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๐๓๐ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปารายการใหม่)

ซึ่งการแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ราชการไม่เสียประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยปรับลดเนืองงานและปรับลดวงเงิน ในสัญญา จำนวน ๑๓๒,๒๖๓.๑๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้น ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบลีสตางค์) รายละเอียดตามตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดยห้างฯ ได้รับทราบและยินยอมให้ปรับลดค่างาน และปรับลดค่าเงิน พร้อมได้ลงนามรับทราบแล้ว

๒. พิจารณาให้ห้างฯ มีสิทธิได้รับการงดหรือลดค่าปรับ นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบพื้นที่ได้

ข้อกฎหมาย และระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

/ (๓) เป็นการแก้ไข...

14
๑๐

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงาน จ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

/คำชี้แจง

49

คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕

ข้อ ๑๕ วรรคสอง “ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบก่อสร้างและจัดทำรายการ ปริมาณงาน และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้องรับรองรายการและปริมาณที่ได้ถอดแบบฯ นั้นไว้ด้วยทุกครั้ง”

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเด็นเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นควรให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับลดปริมาณงาน ลดวงเงินตามสัญญาจ้าง และเปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดโครงการ ดังนี้

จากเดิม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๓๕๙,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐ , ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗
จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๑+๙๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๗๐๙๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๓๗๑๒

แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ลบ.ม. (เฉลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงิน ๒๒๖,๗๓๖.๘๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๑๖๖๐ , ลองจิจูด ๑๐๒.๑๗๙๑๕๗
จุดสิ้นสุดโครงการ กม ๑+๒๐๐ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๗๕๙๙๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๑๖๙๐๓๐ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปรายการใหม่)


๒.งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้หยุดงาน (วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘) จนถึงวันแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบพื้นที่ได้


๓. แจกกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เสนอ
มาพร้อมนี้


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสุณัย ภูมาศ)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



(นายสุริยา นาทัน)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ
๑๑ ก.ค. ๖๘


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายกิตติชัย อุทธา)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา


(นายทวี ศิริชาติวาปี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุริยา นาทัน)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(นายสมเดวิล น้อยวัน)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง


ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายวัลลภ มินิลดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกรุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงนามแล้ว


(นายวิธนา ข้างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



สำนักช่าง อบจ. ชนบท
เลขที่รับ 249
วันที่ 9.12.68

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบจ. ชนบท สำนักยุทธศาสตร์ฯ ส่วนแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณฯ โทร. ๓๓
ที่ ขก ๕๑๐๐๗/ว ๓๖๒๒ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง

- เพื่อโปรดทราบ

- สำนักยุทธศาสตร์ฯ แจ้งเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายฯ ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

- เห็นควรแจ้งให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวดาวรรณ ชุมภักย์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๙ กันยายน ๒๕๖๘

(นางพิชกร สุรสีห์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ทน

- กรวิทย์

- อภิวัฒน์ ตันตราพันธ์

(นายสมถวิล น้อยวัน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จึงอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตาม
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่	
แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	๑๒๑.โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก สายบ้าน ขมิ้น หมู่ที่ ๔ ตำบล ศรีสุข - ตำบลวังใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๓๖๔,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๕๐๑ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นกำหนด (สำนักช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓-๖๐๔ ลำดับที่ ๑๔๒๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๕๐๑ เมตร ทบเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นกำหนด (สำนักช่าง) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓-๖๐๔ ลำดับที่ ๑๔๒๔	เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการ บางส่วน เป็นที่ดินของ ราษฎร จึงทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามแบบ แปลนได้
							งบประมาณ ๓๖๔,๐๐๐ บาท	งบประมาณ ๒๒๖,๓๖๘.๘๔ บาท	

๑. หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนเดิมได้ การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ น้อยวัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น.....

๑๖

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น.....

๔. การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น.....

อนุมัติ

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัย.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ตามหนังสือ.....(ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรวรรณ จุ่มอึ้งวะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

-ไปราชการ-

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรภุณา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
