



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ /

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๗๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะ ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งบริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๔ ธ.ค. ๖๘

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 ธ.ค. 2568

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 ธ.ค. 2568

(นางสาวพัชรินทร์ กัมจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๔ ธ.ค. ๖๘



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๘๙๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ฯ เลขที่ M๖๘๑๐๒๐/๒๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรค

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๘๒๐๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๙๒๕๘๗ เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัท ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการ โดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้ เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การขยายเวลา ดำเนินงานให้แก่บริษัท ฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๘๕๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๘๕๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวนเงินค่าจ้าง ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัท ฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกuma)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๕ หมู่ ๙ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวอณูภา พาหะนิษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๐๕๔๓๐๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
นางสาวอณูภา พาหะนิษฐ์
MILIN
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา..... จำนวน - แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญานับค้ำและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


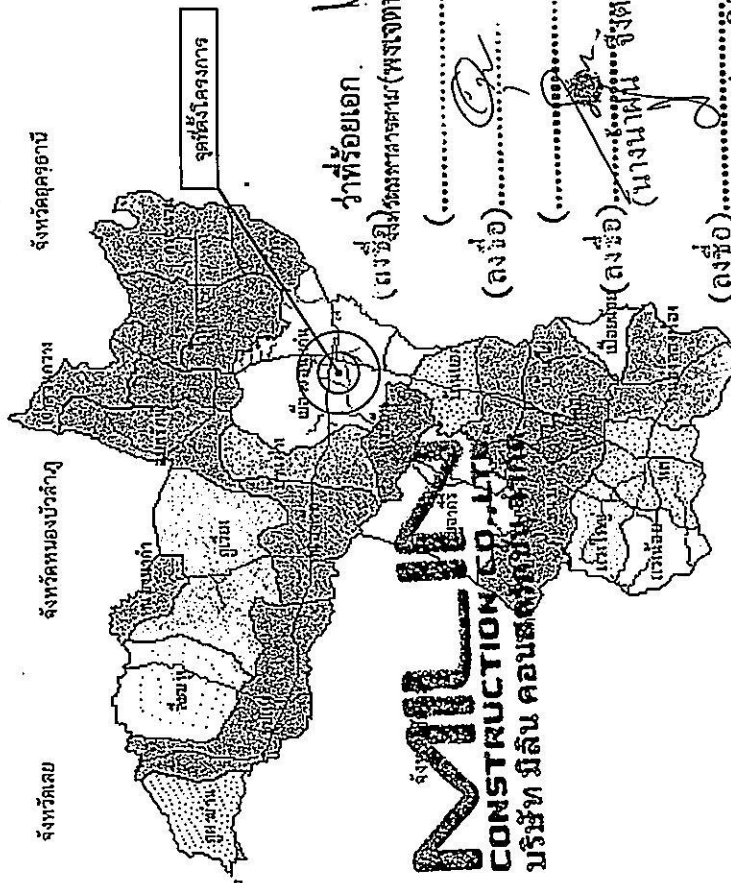
MILIN
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิลัน คอนสตรัคชั่น จำกัด

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอณณา พาพะนิษฐ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

[illegible]

ตั้งหัวคนตกราชสีมา

5542 III	5542 II	5541 IV	5541 III
5542 III	5541 IV	5541 I	5541 II
5541 IV	5541 III	5541 I	5541 II

สารบัญระหว่างแผนก

Abstract

Учредительский комитет

1994

2

!

Abstract

AGG. VRS. MI

๕.๒๖๔๓

เรื่องความผิดฐานลักทรัพย์

• ตามบ้านภูผาว้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเม็งตงเก่า -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น

NATURE

064364787

หน้า ๑๑๑

ขอขอบคุณ
ผู้ร่วมงาน

2

W. L. G.

๑ (นายหงส์อ้อ ใจมั่น)

นายช่วงโชติอากาศโช

๔๔๔

10

17-02-NBI 13AR131E-

အသံထွက်

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1

หัวข้อข่าวผู้ถามมีลักษณะดังนี้

62-0000000-1

1

มัญจาคะรังษี (นายแก้ว สังฆสาครบาล) :

សម្រេច
លេខៈ ០១២

1000

(ហេតុអ្វីបានជា ប្រគល់ជូន)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง (เดิม)			ปริมาณงานก่อสร้างจริง (ใหม่)			หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	
				จำนวนเงิน			จำนวนเงิน	
1	งานปรับเกลี่ยขอบเขตหลุม	200.00	ตร.ม.	60.00	200.00	ตร.ม.	60.00	12,000.00
2	งาน TACK COAT	1,415.00	ตร.ม.	15.00	1,415.00	ตร.ม.	15.00	21,225.00
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริตหนา 0.04 ม.	1,415.00	ตร.ม.	234.00	1,415.00	ตร.ม.	234.00	331,110.00
4	งานตีเส้นจราจร	62.50	ตร.ม.	250.00	62.50	ตร.ม.	250.00	15,625.00
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							379,960.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี							114,040.00
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)						ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)	494,000.00
	ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)							494,000.00
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)							494,000.00
	ผลต่างค่างาน(ที่เพิ่มขึ้น)							-
	คิดเพียง							0%.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ (นางสาวรัชชี่ สุทธิเรือง) (ลงชื่อ).....กรรมการ

ห้างยีนดิงดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกจ้างค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์) (นายภักดิ์ ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพัชรวิมล พลเยี่ยม)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายพงษ์ธร ใจแน่น)

CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท นิสน คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผู้รับจ้าง



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๖๗๕๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๙๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัท ฯ หยุดงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เนื่องจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๘๒๐๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๙๒๕๘๗ เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณอนุมัติให้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างบริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า - ทွ่งหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๘๒๐๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๙๒๕๘๗ เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีความเห็นว่าควรแก้ไขแบบรูปรายการโดยเปลี่ยนจุดดำเนินการจากเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๓๙๖๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปารายการงานก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองเก่า -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จากเดิม

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการ
งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด จุดดำเนินการโครงการ จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๘๒๐๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๒๙๘๗ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๘๓
จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๗๐๔๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๘๔๖๗

แก้ไขเป็น

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๒
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๕ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด จุดดำเนินการโครงการ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่
ละติจูด ๑๖.๓๗๗๐๔๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๘๔๖๗ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๑๙๒ จุดพิกัดที่ ละติจูด
๑๖.๓๗๗๕๑๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๖๗๓๑ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด
๑๖.๓๗๘๐๑๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๔๖๗๙ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๐๙๑ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๘๒๒๗
ลองจิจูด ๑๐๒.๗๕๓๘๔๙ (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
กำหนด)

ซึ่งการเปลี่ยนจุดดำเนินการครั้งนี้อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตาม
สัญญาเดิม (รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบรูปารายการก่อสร้าง) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ขก
๕๑๐๐๕.๔/๘๘๕๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๔.๒ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้พิจารณาให้บริษัท ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้ง
ให้บริษัท ฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับ จำนวน ๖๖ วัน

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์

/(๓) เป็นการแก้ไข...

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๖๖ วัน

๓. แจ้งบริษัท มิลิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อยุติและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๒๓ ธ.ค. ๖๘

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและทรัพย์สิน

๒๓ ธ.ค. ๖๘

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘
