



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ทางหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งทางหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญา

กำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)

เจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

๑๙ ก.พ. ๖๙

ลงนามแล้ว

ว่าที่รองเขค

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

13 ก.พ. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๙ ก.พ. ๖๙

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ก.พ. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๓๔๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ทับซ้อนกับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๒๙ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๓๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าส่วนผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด มิตรชำสูง คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้างในการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน
๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ รวมทั้งทำสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภูณมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรุกณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเตย อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น โดย นายกิตติ์เรนศ โพธิ์ศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๑๘๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๗๕๔.๓๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

ว่าที่ร้อยเอก.....

(พงเจตน์ พรุกณา)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๗๕๔.๓๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
* * *
MSE * * *
บริษัท แสงคอนสตรัคชั่น (นายศักดิ์มงคล เพ็ชรศรี)

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุม
งานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง
ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ล่วงหน้าไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้าง
ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงษ์รัตน์ พรภุณา)




(นางกิตติธเนศ โพธิ์ศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตรีกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)




คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ลงชื่อ *[Signature]* ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)
 ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการฯ
 (นายใหญ่ชัย นามโค)
 ลงชื่อ *[Signature]* กรรมการฯ
 (นายอนุพงษ์ เตชะทอง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเริ่มต้นโครงการ Sta. 0+000


จุดที่ตั้งโครงการ

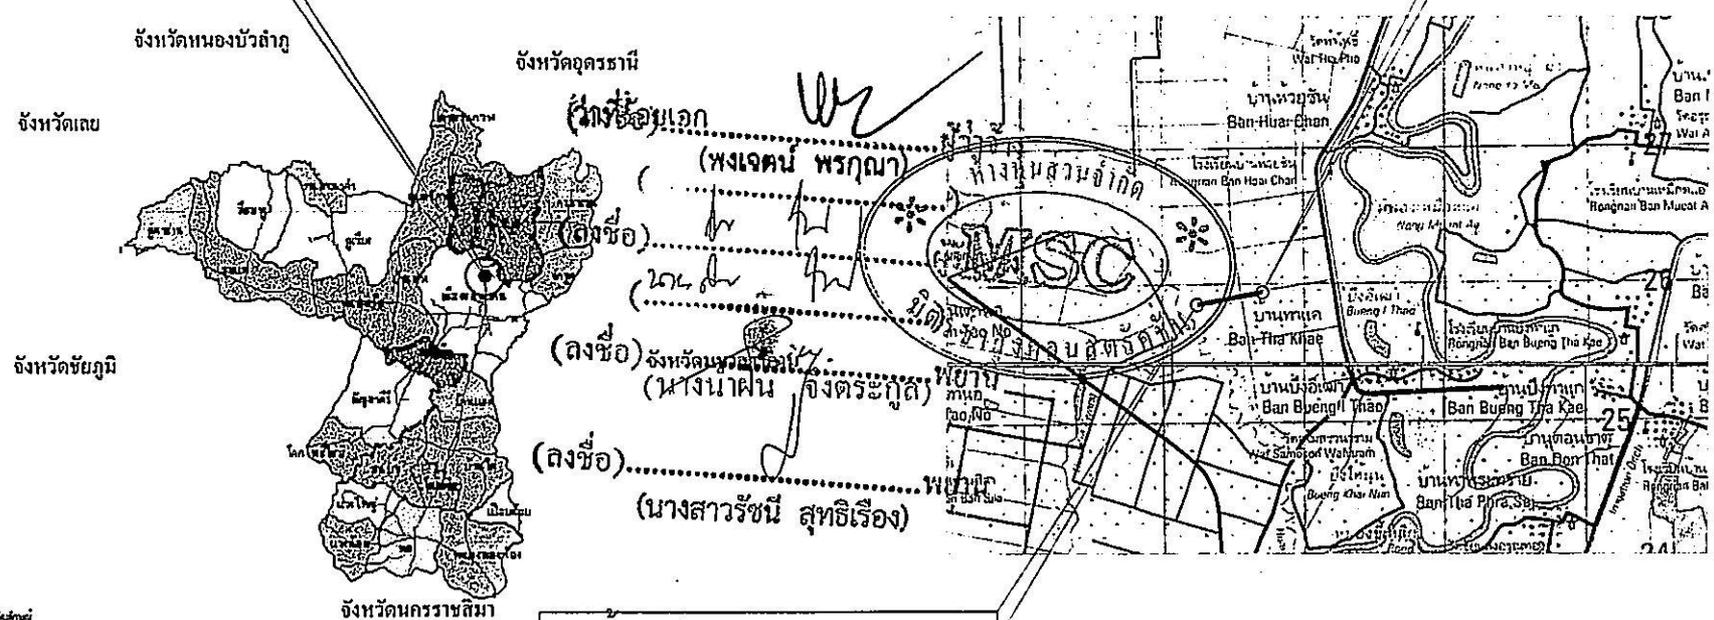

จุดสิ้นสุดโครงการ Sta. 0+221

- สัญลักษณ์
- ทิวเขา (เขตทหาร)
 - ขอบโครงการ / เส้นเขตการก่อสร้าง (เขตทหาร)
 - หนอง, คลอง
 - ฝาย, เขื่อน
 - คูน้ำ
 - ๑. จุดทำ เสาไฟ
 - ๒. เสาไฟ เสาไฟ

สารบัญตารางแผนที่




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	<i>[Signature]</i>	นายสุพจน์ เตชะทอง นายก อบจ. ขอนแก่น	<i>[Signature]</i>
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายวิศิษฐ์ วิเศษ นายก อบจ. ขอนแก่น
แสดงแบบ	แผนที่โครงการ	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น
ลงชื่อ	วันที่	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น
วันที่	จำนวน	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น	นายสุวิทย์ บุญสิงห์ นายก อบจ. ขอนแก่น



จุดสิ้นสุดโครงการ Sta. 0+221

จุดเริ่มต้นโครงการ Sta. 0+000



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 221 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 864 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับนอกจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
- สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้าย่างต่างๆ เกลื่อนออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
- ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมในงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการจัดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
- ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

นางพรอัยเอก (นางเจตน์ พรภักดา) (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวาริณี สุทธิเรือง) (ลงชื่อ).....พยาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวศิริวรรณ สุทธิณะ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายใหญ่ชัย นามโต)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายธนัญพงษ์ เกษรทอง)

พิกัด
 จุดเริ่มต้นโครงการ 16.503682N, 102.892157E
 จุดสิ้นสุดโครงการ 16.503393N, 102.890107E

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบ 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		นายสุภรณ์ เต็มสุข นายก อบจ.ขอนแก่น	 (นายเจตน์ วิชาญ) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง: บริษัท.....
แสดงแบบ	แบบโครงการ	นายสุวิทย์ นามโต ช่างสำรวจ	
เรขาคณิต	ชนิดที่ 1	นายศิริวิรัตน์ ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง โครงการถนนสาย.....	
ขนาด	จำนวน 3 แผ่น	นายศิริวิรัตน์ ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง โครงการถนนสาย.....	 (นายทวิวัฒน์ คำเรือง) ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้าง: บริษัท.....

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ 241/2569 ลงวันที่ 5 มกราคม 2569
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วงเงินความสัญญาจ้าง 486,000.00 บาท
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 6 มกราคม 2569
 ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 5 เมษายน 2569
 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรจำสูง คอนสตรัคชั่น วันที่ 28-ม.ค.-69

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าสัญญาจ้าง				ราคาที่ต้องเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	
1	งานดิน									รวมค่าแรง
	1.1 งานวางป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	884.00	ตร.ม.	2.00	1,768.00	884.00	ตร.ม.	2.00	1,768.00	
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต									
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	44.20	ลบ.ม.	675.00	29,835.00	44.20	ลบ.ม.	675.00	29,835.00	
3	งานผิวทาง									
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	884.00	ตร.ม.	363.00	320,892.00	884.00	ตร.ม.	363.00	320,892.00	
	3.2 รอยต่อเอนขยายตามขวาง (Expansion Joint)	16.00	ม.	330.00	5,280.00	16.00	ม.	330.00	5,280.00	
	3.3 รอยต่อเอนหดตามขวาง (Contraction Joint)	72.00	ม.	150.00	10,800.00	72.00	ม.	150.00	10,800.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				368,575.00				368,575.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+กำไร+ภาษี				117,425.00				117,425.00	
	ราคารวม				486,000.00				486,000.00	

รวมราคา (พิกัด) (.....) 486,000.00 บาท
 - รวมราคาค่าสัญญาจ้าง (.....) 486,000.00 บาท
 - รวมราคาที่ต้องเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (.....) - บาท
 - รวมราคาเพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) (.....) - บาท
 - รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = B-A) (.....) - บาท

หมายเหตุ (นางสาวศิริวรรณ จรุงตระกุล) (นางสาวศิริวรรณ จรุงตระกุล)
 - ราคาค่ารวม Factor F แล้ว
 - ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้ (นางสาวศิริวรรณ จรุงตระกุล)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวศิริวรรณ จรุงตระกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายไพบุลย์ นามโต)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการฯ
 (นายบุญพงศ์ เท็จรทอง)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น



ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
 (นายสุพจน์ เพิ่มพูล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ทับซ้อนกับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ของเทศบาล เมืองศิลา ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการ ให้ตรงกับพื้นที่จริง และได้พิจารณาให้ทางฯหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูป รายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมระยะเวลา ๒๕ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๐๕/๒๕๖๕	๔๘๖,๐๐๐.๐๐			๔๘๖,๐๐๐.๐๐



ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติ์ธเนศ โพธิ์ศรี)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๒๒๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง
แจ้งผู้รับจ้างขอหยุดงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ทางฯ หยุดงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ทับซ้อนกับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา ส่งผลให้ทางฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง ซึ่งได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๒๙ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยาย ระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งทางฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาเท่าเดิมจำนวน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกฤษณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชำสูง คอนสตรัคชั่น ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอย ๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก.๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีพื้นที่ทับซ้อนกับ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองศิลา ส่งผลให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๑๗๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙,

๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้ จุดดำเนินการเดิม จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๓๙๘๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๙๔๒๑๒ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๒๑ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๓๗๑๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๙๒๑๘๕ แก้ไขเป็น จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๓๖๘๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๙๒๑๕๗ ถึง จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๒๑ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๕๐๓๓๙๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๘๙๐๑๐๗ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๕/๔๙๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๒๙ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างคือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุ เกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตาม เงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุ นั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการ แก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา ในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขต แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อกำหนดและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือ ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือ ข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุด ลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลด ค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่ม วงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้


๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง


๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๒๙ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๓. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรชาสูง คอนสตรัคชั่น เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้


(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
18 ก.พ. 69


(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่


(นางสาวพัชรินทร์ อี่ยมจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

18 ก.พ. 69


(นางอาชีษะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ก.พ. 2569

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก


(พงเจตน์ พวกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ก.พ. 2569
