



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) เป็นผู้รับจ้าง วงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๗๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและขอเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้


๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

เจ้าหน้าที่



(นางวิมลพิวีณ์ สิบสาย)

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

31/๒/๖๙

ลงนามแล้ว



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

3๑๙๕.๐๙

ว่าที่ร้อยเอก



(พงเจตน์ พรภณา)

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


3 เม.ย. 2569

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

- สำนักปลัด
- สำนักงานเลขานุการ
- กองคลัง
- สำนักช่าง
- กองสาธารณสุข
- สำนักยุทธศาสตร์
- สำนักงานการศึกษา
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- กองกิจการขนส่ง
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองการช่าง
- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

๑๑.๕๐
 เวลา
 วันที่ 3 เม.ย. 2569
 ที่ ๑๓๑๗
 ๑๑.๕๐
 ๑๑.๕๐
 ๑๑.๕๐

3 เมษายน 2569



เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการ ครั้งที่ 2

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 169/2568 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

2. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 51021/4750 ลงวันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ห้างได้ทำสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกลุ่ม นางสาวชญญา มาศรี เจ้าของที่ดิน ไร่เอกสาร ภ.บ.ท.5 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ซึ่ง ภ.บ.ท.5 เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ์ของประเภทที่ดินหรือหนังสือเข้าทำประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแนบประกอบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดเงิน ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน 247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางฯจึงขอแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์ การโยธา (๒๐๐๑) แจ้งเข้าดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นสมควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้

ควบคุมงานทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์ การโยธา (๒๐๐๑)
 (หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)
 หัวหน้าผู้จัดการ
 ว่าที่ร้อยเอก

ทราบ

Wj

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Wj
 (นางพิมพ์ปวีณ์ สืบสาย)
 หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
 31เมษ๖๙

Sain
 (นางน้ำฝน จิงตระกูล)
 เจ้าหน้าที่

Wj
 (นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
 ผู้อำนวยการกองช่างและทรัพย์สิน
 3 เม.ย. 69.

Wj
 (นางอาชีวะห์ ว่องไว)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 3 เม.ย. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๘๐๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การงดหรือลดค่าปรับ

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑)

อ้างถึง หนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แจ้งขอหยุดงานและขอยกสัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
เพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างฯ ได้แจ้งขอหยุดงานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) เนื่องจากกลุ่ม น.ส.ชัญญา มาศรี เจ้าของที่ดิน ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.๕ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือ
ใช้น้ำบาดาล ซึ่ง ภ.บ.ท.๕ เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิ์ของประเภทที่ดินหรือหนังสือ
เข้าทำประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแนบประกอบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ ส่งผลให้
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการ
แก้ไขแบบรูปรายการ ปรับลดเงิน ลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ห้างฯ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นชอบงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิงดลดค่าปรับจำนวน ๑๐๓ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรุกฎา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๘๐๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๗๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ จำนวนเงินค่าจ้าง ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้าง ฯ เข้าดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดย หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๒๔๙๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมได้นำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่งคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้


- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ.....จำนวน ๕ แผ่น
- ๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๓ แผ่น
- ๒.๓ ผนวก ๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา.....จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่งคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๖,๑๕๘.๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๙๔.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๔๗.๐๐ - บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ว่าที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรภุณา) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานตามแบบแปลนเดิม		ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง		ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง		หมายเหตุ	
			ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	ปริมาณงาน	ราคา ต่อหน่วย	ปริมาณงาน (เพิ่ม +), (ลด -)	จำนวนเงิน (บาท)		
2.9	เหล็กเสริมพื้นตะแกรงไวรเมช ศก. 4 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	22.00	27.00	22.00	27.00	594.00	-	-	
2.10	ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก	กก.	213.52	10.00	213.52	10.00	2,135.20	-	-	
2.11	ทาสีน้ำมันกันสนิม	ตร.ม.	15.90	100.00	15.90	100.00	1,590.00	-	-	
2.12	ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	ทอน	1.00	1,530.00	1.00	1,530.00	1,530.00	-	-	
2.13	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	งาน	1.00	500.00	1.00	500.00	500.00	-	-	
3 งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์										
3.1	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ (MONO HALF CELL SOLAR PANEL) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	แผง	6.00	6,100.00	6.00	6,100.00	36,600.00	-	-	
3.2	DC Circuit Braker 2P 32 A 1000 V	ชุด	1.00	155.00	1.00	155.00	155.00	-	-	
3.3	สเตริปเรชชิ่ง (Surge Protection DC) 2P 1000 VDC 40kA (สังกะสี)	ชุด	1.00	400.00	1.00	400.00	400.00	-	-	
3.4	ระบบกราวด์ (ระบบสายดิน) แห่งทองแดง 5/8" ยาว 6 ฟุต	ชุด	1.00	150.00	1.00	150.00	150.00	-	-	
4 งานสายไฟฟ้า และท่อสูบลม										
4.1	กล่องควบคุมตู้เหล็กกันน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 35x52x17 ซม.	กล่อง	1.00	680.00	1.00	680.00	680.00	-	-	
4.2	กล่องเหล็กกันโมยพร้อมกุญแจล็อก (2x1 นิ้ว ทน 1.2 (สังกะสี) - ทางสารวัตร สู่ทีวีรื่อง)	ชุด	1.00	1,000.00	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	
4.3	สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ VCT 3x4 ตร.มม. 450/750V	เมตร	70.00	85.00	70.00	85.00	5,950.00	-	-	
4.4	สายไฟฟ้า PV1-F 1x4.0 ตร.มม.	เมตร	22.43	45.00	22.43	45.00	1,009.35	-	-	
4.5	สายไฟฟ้า THW 10 ตร.มม.	เมตร	3.00	56.00	3.00	56.00	168.00	-	-	
4.6	ท่อร้อยสายไฟ 1/2"	เมตร	20.00	15.00	20.00	15.00	300.00	-	-	
4.7	ท่อสูบลม PVC. Ø 1 1/2 นิ้ว ชนิดสายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	ทอน	14.00	280.00	14.00	280.00	3,920.00	-	-	
4.8	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC. Ø 1 1/2 นิ้ว	ชุด	14.00	40.00	14.00	40.00	560.00	-	-	



องค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานส่งเสริมการเกษตร เขต 1 กรุงเทพมหานคร

แบบแสดง
แบบแสดงวิธีปฏิบัติงานแบบพิมพ์-ประกอบ
ชนิดที่ ๒๒๒๒๒๒๒๒

นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตราจตุรัส
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

ตราจตุรัส
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


ตราจตุรัส
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

เห็นชอบ
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

แบบแสดง
นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี

แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ (monocrystalline silicon Solarcell) Tier1 จำนวน 6 แผง จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 3,300 วัตต์

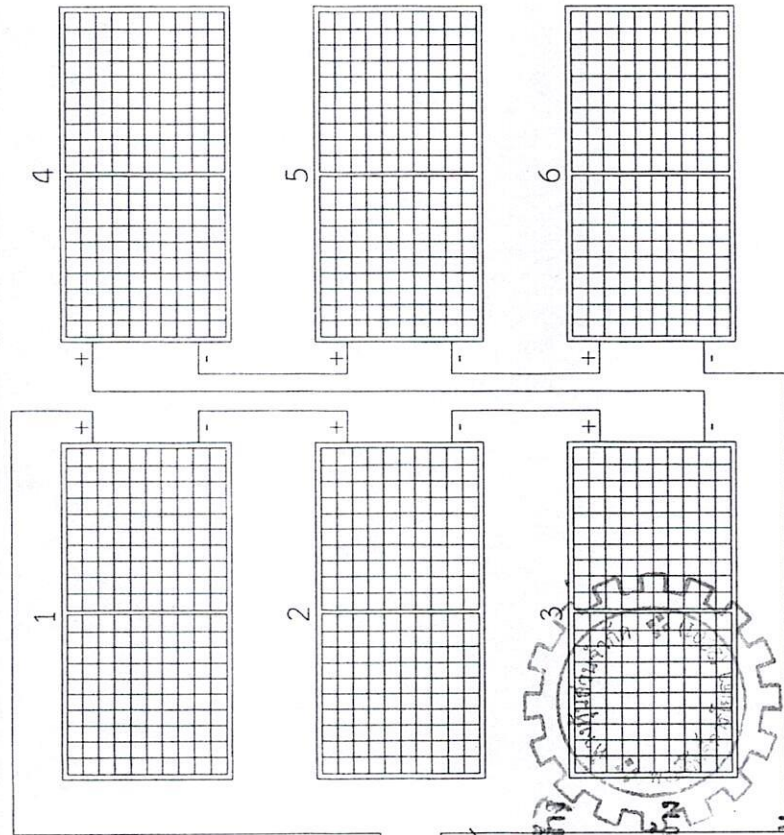

(นายสมชาย ใจดี)
นายช่างโยธาอาวุโส

DC Circuit Breaker
2P 32 A 550 V

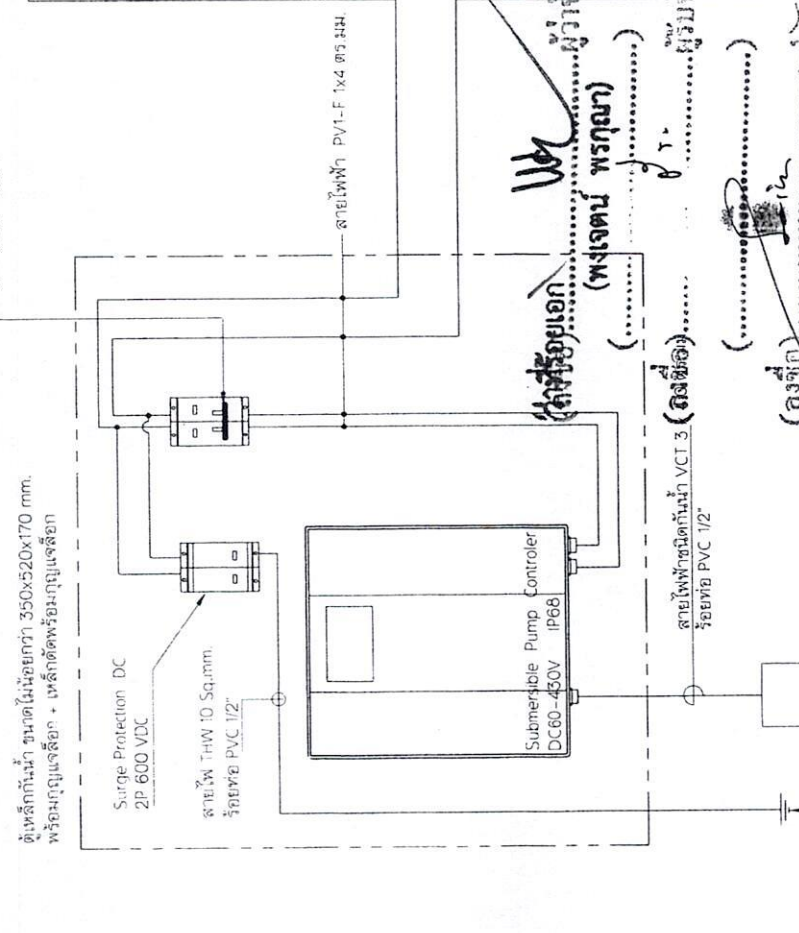


ตู้เหล็กกันน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 350x520x170 mm. พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ + เซลล์ดีพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ

Surge Protection DC
2P 600 VDC

สายไฟ THW 10 Sq.mm. รัยต่อ PVC 1/2"

Submersible Pump Controller
DC60-430V IP68

สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ VCT 3 (ลิงค์เชื่อม) รัยต่อ PVC 1/2"

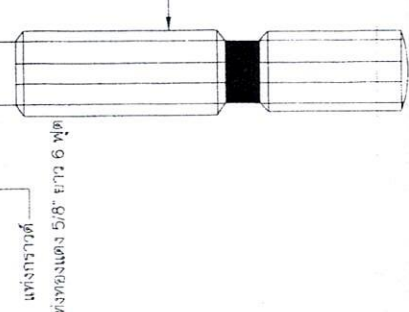

แท่งกรวด
แรงดันคงที่ 5.8" ยาว 6 ฟุต

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นางนงนุช อิงตระกูล)

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ที่มี (ลิงค์เชื่อม) สายไฟฟ้าชนิดกันน้ำ (ลิงค์เชื่อม) เซลล์ดีพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ (ลิงค์เชื่อม) ปริมาณน้ำที่ได้ในกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3 ลิบ.วินาที ที่ความลึกที่ขุดถึงน้ำ

- อย่างน้อยต้องมีระบบป้องกันมีน้ำ ดังนี้
1. ตัดน้ำออกอัตโนมัติ กรณีน้ำแห้ง
 2. มีระบบป้องกัน แรงดันไฟตก
 3. มีระบบป้องกัน แรงดันไฟเกิน
 4. มีระบบป้องกัน การต่อลัดวงจร

แบบแสดงตัวอย่างไดอะแกรมไฟฟ้าระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญา มีปริมาณงานลดลงคิดเป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบ ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง คงเหลือวงเงิน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๒/๒๕๖๙	๒๔๗,๐๐๐.๐๐			๒๔๗,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....



ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกณา)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

(หม่อมหลวงธีระศักดิ์ วิไลวงศ์)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๔๗๕๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑)

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๗๒๘๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน โครงการขุดเจาะ
บ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอ
บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เนื่องจากกลุ่ม
น.ส.ชญญา มาศรี เจ้าของที่ดิน ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.๕ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ซึ่ง ภ.บ.ท.๕
เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิของประเภทที่ดินหรือหนังสือเข้าทำประโยชน์ที่ดิน
แต่อย่างใด ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแนบประกอบคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ
ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการ
ปรับลดเงิน ปรับลดปริมาณงาน และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งห้างฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
แก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา วงเงินตามสัญญาลดลง ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตนร์ พรุกณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) ดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงาน ตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจากกลุ่ม น.ส.สัญญา มาศรี เจ้าของที่ดิน ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.๕ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ซึ่ง ภ.บ.ท.๕ เป็นเพียงหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่ใช่ เอกสารแสดงสิทธิของประเภทที่ดินหรือหนังสือเข้าทำประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารแนบประกอบ คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมาตรฐานงานก่อสร้าง จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการแล้วเสร็จและแจ้งส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ นั้น

๒. การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้น ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔. การขอแก้ไขสัญญา มีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ การแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง มีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแก่นคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ จุด ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร ขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า DC Brushless ๑๑๐๐ W รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด วงเงินลดลงเหลือ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จากการแก้ไขแบบรูปรายการครั้งนี้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา มีผลกระทบต่อปริมาณงานและมูลค่าของการก่อสร้าง ซึ่งผู้ควบคุมงานได้จัดทำใบเปรียบเทียบปริมาณงาน ของโครงการดังกล่าวพบว่า ค่างานลดลงเป็นวงเงินจำนวน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง โดยทางห้างฯ ยินยอมให้ปรับลดปริมาณงานและเงินค่าจ้างได้

๔.๒ การขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างตามหนังสือห้างฯ นั้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องดำเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จึงไม่สามารถขยายเวลาดำเนินงานได้ เห็นควรลดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่แจ้งให้ห้างฯ หยุดงาน จนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิลดค่าปรับจำนวน ๑๐๓ วัน

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือ ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้


๑. แก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการและปรับลดปริมาณงานลง หลังปรับลดค่างานคงเหลือวงเงินตามสัญญา ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


๒. งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิถึงลดค่าปรับจำนวน ๑๐๓ วัน


๓. แจ้งหักหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ศักดิ์การโยธา (๒๐๐๑) เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้



(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่


(นางน้ำฝน จิงตระกูล) สิบสาย
มีหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๒๑.๒.๖๙


(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๒๖.๒.๖๙


(นางอาชีชะห์ ว่องไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒ เม.ย. ๒๕๖๙

อนุมัติ


ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรุกณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
