

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑ /ว ๑๗๒๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจำนวน ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ซึ่ง บริษัท อู่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. นายนำศิลป์ วิเศษ
๒. นายเอกบุรุษ สมสุข
๓. นางสุวลี ศิริธรรมจักร
ผู้ควบคุมงาน
นายธนกฤต เปรี่ยจำเริญ

○ สำนักปลัด ○ สำนักการศึกษาฯ
○ สำนักปลัดเทศมนตรี ○ หน่วยตรวจสอบภายใน
○ กองคลัง ○ กองกิจการขนส่ง
○ สำนักช่าง ○ กองพัสดุและทรัพย์สิน
○ กองสาธารณสุข ○ กองการเจ้าหน้าที่
○ สำนักยุทธศาสตร์ฯ ○ กองการท่องเที่ยวฯ

คการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ ๑๗๙๙๙
๑๐ พ.ย. 2569
เวลา ๑๓.๓๒ น.

Auh inter group
บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
122 หมู่ 16 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-4055-62004-89-1
โทร. (043) 238199, Mobile 081-4711888 , email : kaijs1@hotmail.com , auhinter @ hotmail.com

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เลขรับที่ ๒๕๔๑
วันที่ 10 พ.ย. 2569
เวลา ๑๓.๔๐

เลขที่ Auh.289/2569

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการหลังจากหยุดงานชั่วคราว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง 1. สัญญาเลขที่ 740/2569 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

2. สำเนาหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

เนื่องด้วย บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงินทั้งสิ้น 3,095,000.-บาท (-สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

บัดนี้ทาง บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด มีความประสงค์ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการแล้ว หลังจากทางผู้ว่าจ้างแจ้งให้หยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานบางส่วนทับซ้อนกับรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยให้เริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 รวมระยะเวลา 37 วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานรับทราบต่อไปด้วย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด แจ้งเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๐ พ.ย. ๖๙

ขอแสดงความนับถือ
(นายวชิรเดชรัตชัย เรืองโลหะฤทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ทราบ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อู่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกำพร กาฬพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๗๕๔๕๐๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๒ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๒๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๒ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกำพร กาฬพันธ์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสุจินกาพร กาฬพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเชษฎ์ พรกุณา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวจรรศิพร กาฬพันธ์)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

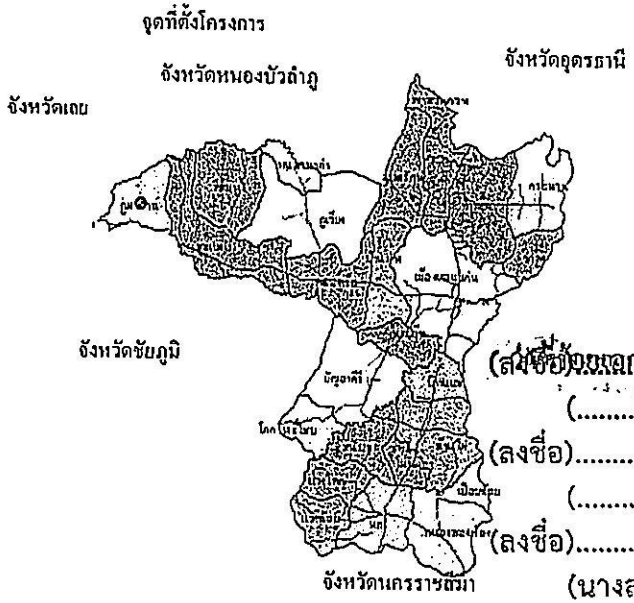

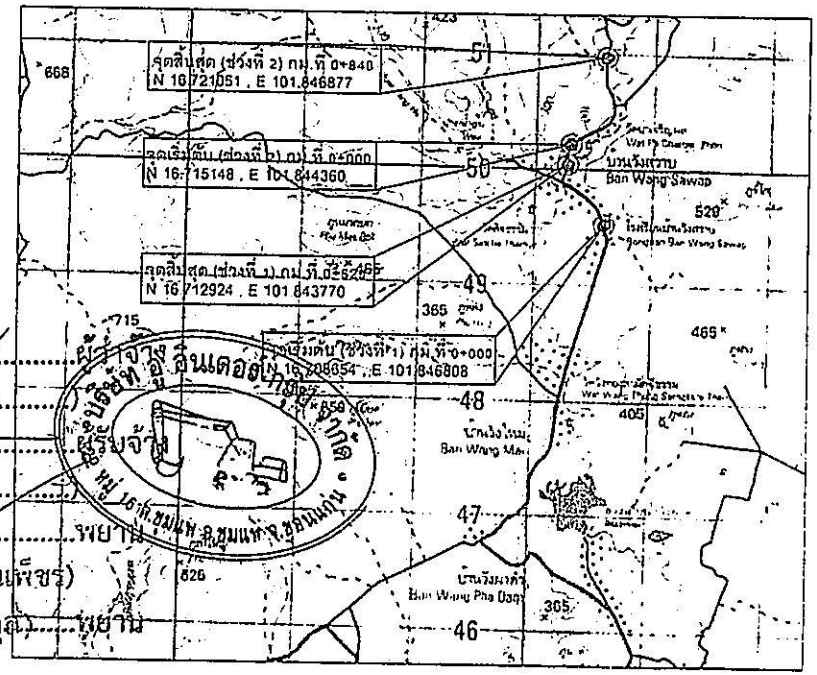

(สมชาย ขยันกลาง)
(พังเจตน์ พรคุณา)
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร์)
(ลงชื่อ) (นางน้ำฝน จังตระกูล) ชยาน

อนุมัติ

สารบัญระวางแผนที่

5342 IV	5542 I	5442 IV
5342 III	5342 II	5442 III
5341 IV	5341 I	5441 IV

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
ขก.ถ. 1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


ผู้ควบคุมงาน

ประธานกรรมการ

แถลงแบบ
แผนที่จังหวัด

เลขที่แบบ _____ แผ่นที่ _____

วงกบ _____ จำนวน _____ แผ่น

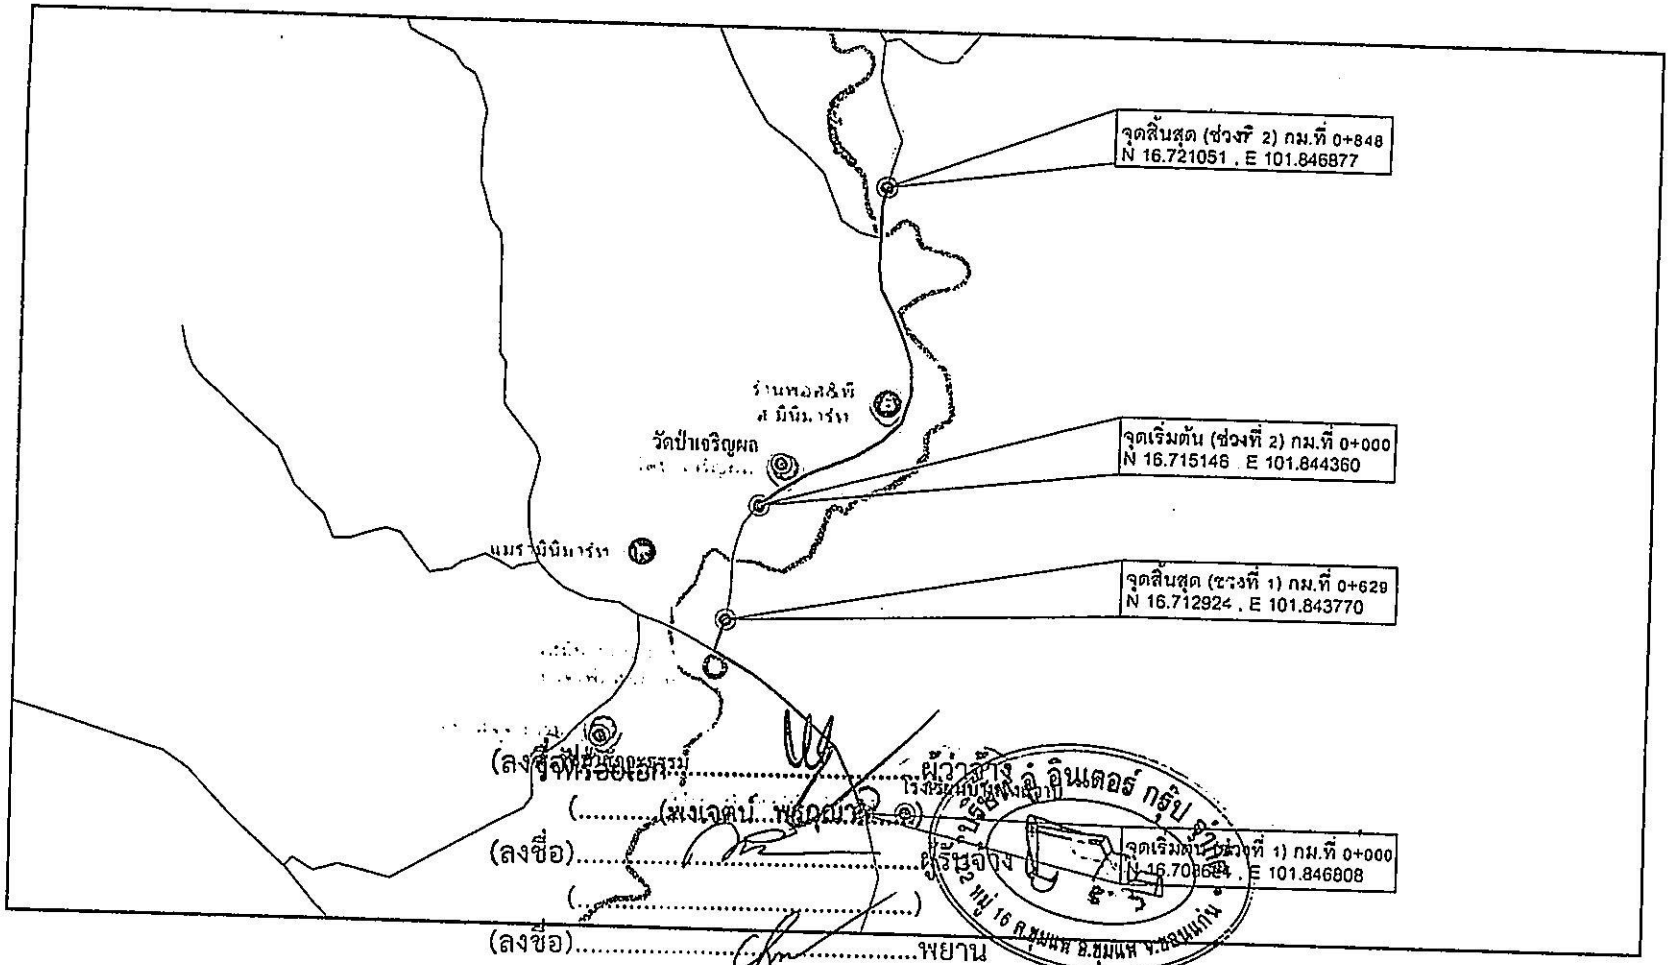

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปัทมา ภูพานเพ็ชร)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางบำเพ็ญ จิ่งตระกูล)

อนุมัติ
วันที่ร้อยเอก
(นายเจตน์ พลคุณา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ
การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ยาว ความหนาเฉลี่ย รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร หรือพื้นที่ตารางเมตร โดยให้พื้นที่ตารางเมตร หรือพื้นที่ตารางเมตร เป็นไปตามที่กำหนดในแบบแปลน

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
   ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 629 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 848 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 1,477 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 8,862 ตารางเมตร และดีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
3. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เสาวิ้นและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการจัดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
5. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
6. ระยะเวลาการก่อสร้างได้เผื่อระยะเวลาการอผลทดสอบไว้แล้ว หากห้างานล่าช้า จะนำเอาเหตุรอผลทดสอบมาลดหย่อนค่าปรับไม่ได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ: ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ. 1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ผู้ควบคุมงาน
แสดงแบบ: แผ่นที่จังหวัด	ตัวแทนผู้รับจ้าง
เลขที่แบบ..... แผ่นที่.....	
ว/ด/ป ..... จำนวน..... แผ่น	

ผู้ว่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนน บริษัท รู อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2 หมู่ 16 ต.ขุมแห ก.ขุมแห จ.ขอนแก่น

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง (เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง (ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	8,862.00	ตร.ม.	1.95	17,280.90	8,862.00	ตร.ม.	1.95	17,280.90	
2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	8,862.00	ตร.ม.	16.34	144,805.08	8,862.00	ตร.ม.	16.34	144,805.08	
3	งานขั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	8,862.00	ตร.ม.	321.20	2,846,474.40	8,862.00	ตร.ม.	321.20	2,846,474.40	
4	งานตีเส้นจราจร	332.00	ตร.ม.	260.37	86,442.84	332.00	ตร.ม.	260.37	86,442.84	
		(ลงชื่อที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง								
		(.....(พงเจตน์ พรัญญา).....)								
		(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง								
	วงเงินตามเสนอ	(.....)			3,095,003.22				3,095,003.22	
	ปรับราคาตามสัญญาจ้าง (เดิม)	(ลงชื่อ).....พยาน			3,095,000.00				3,095,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)	(นางสาวปพิตตา ภูพานเพ็ชร)						ราคาก่อสร้างจริง	3,095,000.00	
	ผลต่างค่างาน (ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)	(ลงชื่อ).....พยาน							-	
	ปรับราคาคิดเพียง	(นางน เฝน จังตระกูล)			(สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				3,095,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายธนกฤต เปรียวจำเริญ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกบุรุษ สมสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุวลี ศิริธรรมจักร)

ห้างยินดีจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกร้องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง แต่อย่างใด
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกำพร กาฬพันธ์)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๙ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างมีจุดดำเนินการทับซ้อนกับแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับโครงการอื่น เป็นระยะทางรวม ๒๖๐ เมตร ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๓๗ วัน โดยสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๒/๒๕๗๐	๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐			๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกำพร กาฬพันธ์)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท อู่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งบริษัท อู่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง บริษัท อู่ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ และ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน และผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือบริษัท ฯ เลขที่ Auh.๑๗๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๔๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๙ มีจุดดำเนินการทับซ้อนกับแบบรูปรายการงานก่อสร้างกับโครงการอื่น เป็นระยะทางรวม ๒๖๐ เมตร ส่งผลต่อความยาวของงานปรับปรุงไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และจากการตรวจสอบพื้นที่บนแนวถนนเส้นเดิม พบว่ายังมีพื้นที่ที่สามารถดำเนินโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตรและใช้ในการสัญจรไป-มา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือสำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๒๗๑๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

จุดดำเนินการเดิม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๗๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๒ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด จำนวนเงิน ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๐๘๖๕๔ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๖๘๐๘
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๑๘๘๖๓ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๗๔๔๘

/แก้ไขเป็น...

<u>แก้ไขเป็น</u>

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขก.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๒๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๔๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๘๖๒ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด จำนวนเงิน ๓,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ - กม. ๐+๖๒๙
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๐๘๖๕๔ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๖๘๐๘
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๑๒๙๒๔ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๓๗๗๐
ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ - กม. ๐+๘๔๘
จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๑๕๑๔๘ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๔๓๖๐
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๗๒๑๐๕๑ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๖๘๗๗

ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๖๗๗๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ และการแก้ไขสัญญาครั้งนี้อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมและไม่กระทบต่อวงเงินตามสัญญา

๓. ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดโครงการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

๔. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๓๗ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๕. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

/๕. การแก้ไข...

๖. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

<u>ข้อกฎหมายและระเบียบ</u>

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

/๑.๓ ระเบียบ...

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๓๗ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

๓. แจ้งบริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๕ พย ๖๙

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๕ พย. ๖๙

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
05 พ.ย. 2569

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
