สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๗๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓/๕๙๘ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๒๕๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๙,๖๓๕.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

SD 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวเจวารินทร์ พงษ์คำพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)


แบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานช่วงที่ 1					
	งานถากถางและรื้อถอนต้นไม้	ตร.ม.	800.00	2.67	2,139.68	0%
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	560.00	149.78	83,875.46	5%
	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	120.00	486.11	58,333.03	3%
2	งานช่วงที่ 2					
	งานถากถางและรื้อถอนต้นไม้	ตร.ม.	6,400.00	2.67	17,117.44	1%
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	6,720.00	149.78	1,006,505.47	60%
	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,032.00	486.11	501,664.02	30%
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00		-	0%
				รวม	1,669,635.10	100%

1	2	3	4	5
ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์
100%	50%	50%	50%	50%
	50%			

(สงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)
(.....)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวปิ่นตา ภูพานเพชร
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน ถังตระกูล)

SD 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

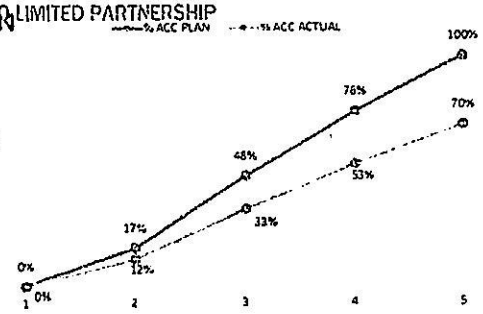

	1	2	3	4	5
Money	1,711.74	275,676.37	522,421.59	467,540.94	402,284.45
AccMoney	1,711.74	277,388.12	799,809.71	1,267,350.65	1,669,635.10
% PLAN	0%	17%	31%	28%	24%
% ACC PLAN	0%	17%	48%	76%	100%
% ACTUAL	0%	12%	22%	20%	17%
% ACC ACTUAL	0%	12%	33%	53%	70%
% ACC DIFF	0%	5%	14%	23%	30%
% PLAN/2	0%	8%	16%	14%	12%
% PLAN/2 DIFF	0%	-3%	-6%	-6%	-5%

หมายเหตุ:
1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 5 เดือน
2) 4 หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
3) 25 หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ

SD 2000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี 2000
SD 2000 LIMITED PARTNERSHIP

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชีบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๑,๖๖๙,๖๓๕.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๔๐๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๖ พ.ย. ๖๙

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำชี บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๙,๖๓๕.๑๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ห้างฯ ส่งแผนการดำเนินงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๐๕๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา"

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๗๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/ ๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

<u>ข้อพิจารณาและข้อเสนอ</u>

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒/๒๕๗๐

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน_____๑_____แผ่น

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ๒๐๐๐ เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
๕ พย ๖๙

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๕ พย ๖๙

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๕ พ.ย. ๖๙
