บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐ – ๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑ / ว๑๗๔๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ควบคุมงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขสัญญาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจำนวน ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ ซึ่ง บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบรายการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม ข้อ ๑๗๖ และข้อ ๑๗๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางวรรณภา พุดสี

๒. นางบุษกร ศรีสุวรรณ์

๓. นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ

ผู้ควบคุมงาน

นายธนกฤต เปรี่ยวจำเริญ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ในฐานะผู้ว่าจ้าง

๒. แจ้งบริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด เข้าดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สัญญากำหนด

๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

(นางสาวจันธิรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๙ พ.ย. ๖๙

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๙ พ.ย. ๖๙

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๙ พ.ย. 2569



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๕๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งมอบ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙
๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น สัญญาจ้างเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ,สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๕๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการดำเนินโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญาจำนวน ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอให้ห้างฯ เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรหฺณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๔๔/๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนางสาวกาญจนา เทพมง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๐๑๕๒๐๐๐๔๐๐๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๓,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๘๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด
CHADAKAN CONCRETE CO.,LTD.

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา) (นางสาวกาญจนา เทพมง)

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๓,๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๘๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ(เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

๒.๓ เอกสารแนบท้าย จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๔,๔๖๗.๒๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนด การจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

บริษัท ชาคากานต์ คอนกรีต จำกัด
CHADAKAN CONCRETE CO.,LTD

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา) (นางสาวกาญจนา เทพมง)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานลาดยาง Tack Coat จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจร จำนวน ๔๕๐ ตร.ม.
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานลาดยาง Tack Coat จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจร จำนวน ๒๗๗ ตร.ม. และงานอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๔๔,๔๖๗.๒๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานลาดยาง Tack Coat จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๑๒,๐๐๐ ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจร จำนวน ๔๕๐ ตร.ม.
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

บริษัท ชาดากานส์ คอนกรีต จำกัด
CHADAKAN CONCRETE CO.,LTD.

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เทพมง)

งวดที่ ๒ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานลาดยาง Tack Coat จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๗,๓๘๐ ตร.ม.
- งานตีเส้นจราจร จำนวน ๒๗๗ ตร.ม. และงานอื่นๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๘ มีนาคม ๒๕๗๐

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

บริษัท ชาดากรุ๊ป [illegible]
CHADAKORN GROUP [illegible]

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา) (นางสาวกาญจนา เทพมง)

ข้อความใหม่

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เทพมง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปทิตตา ภูพานเพ็ชร)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

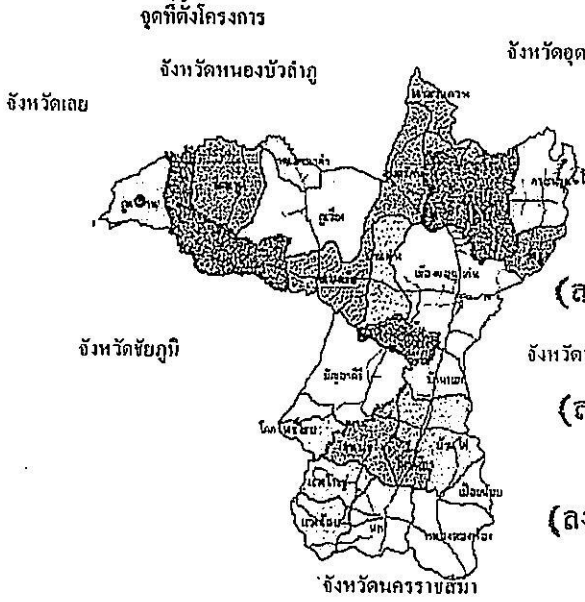

(ลงชื่อ)
วาทีร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรกุณา)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จึงตระกูล)
(ลงชื่อ).....พยาน
อนุมัติ
นางสาวบัทตรา ภูพานเพ็ชร
วาทีร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

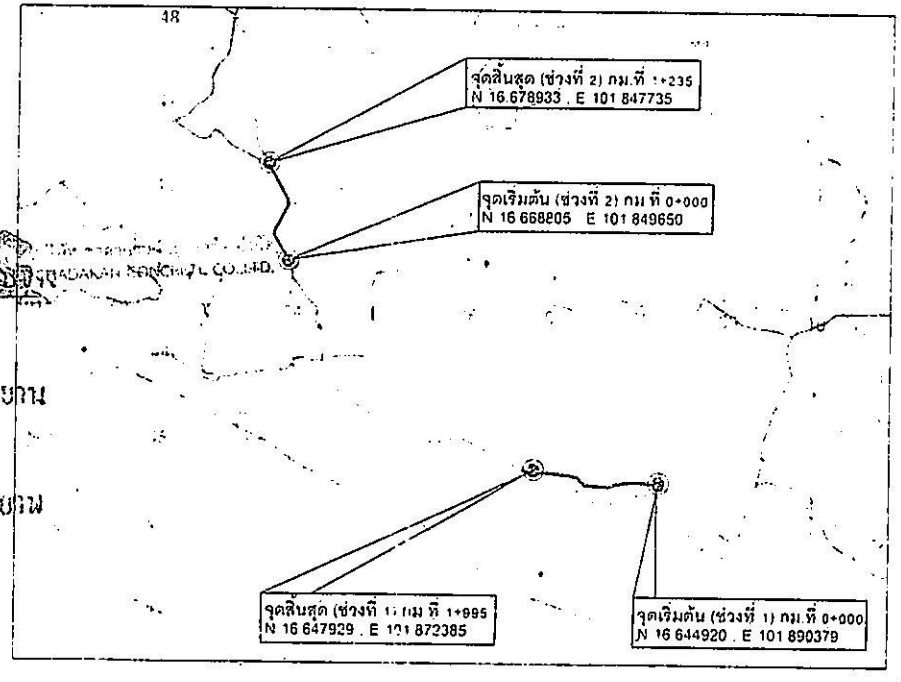

สารบัญระวางแผนที่

5342 IV	5542 I	5442 IV
5342 III	5342 II	5442 III
5341 IV	5341 I	5441 IV

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0007
บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แสดงแบบ
แผนที่จังหวัด

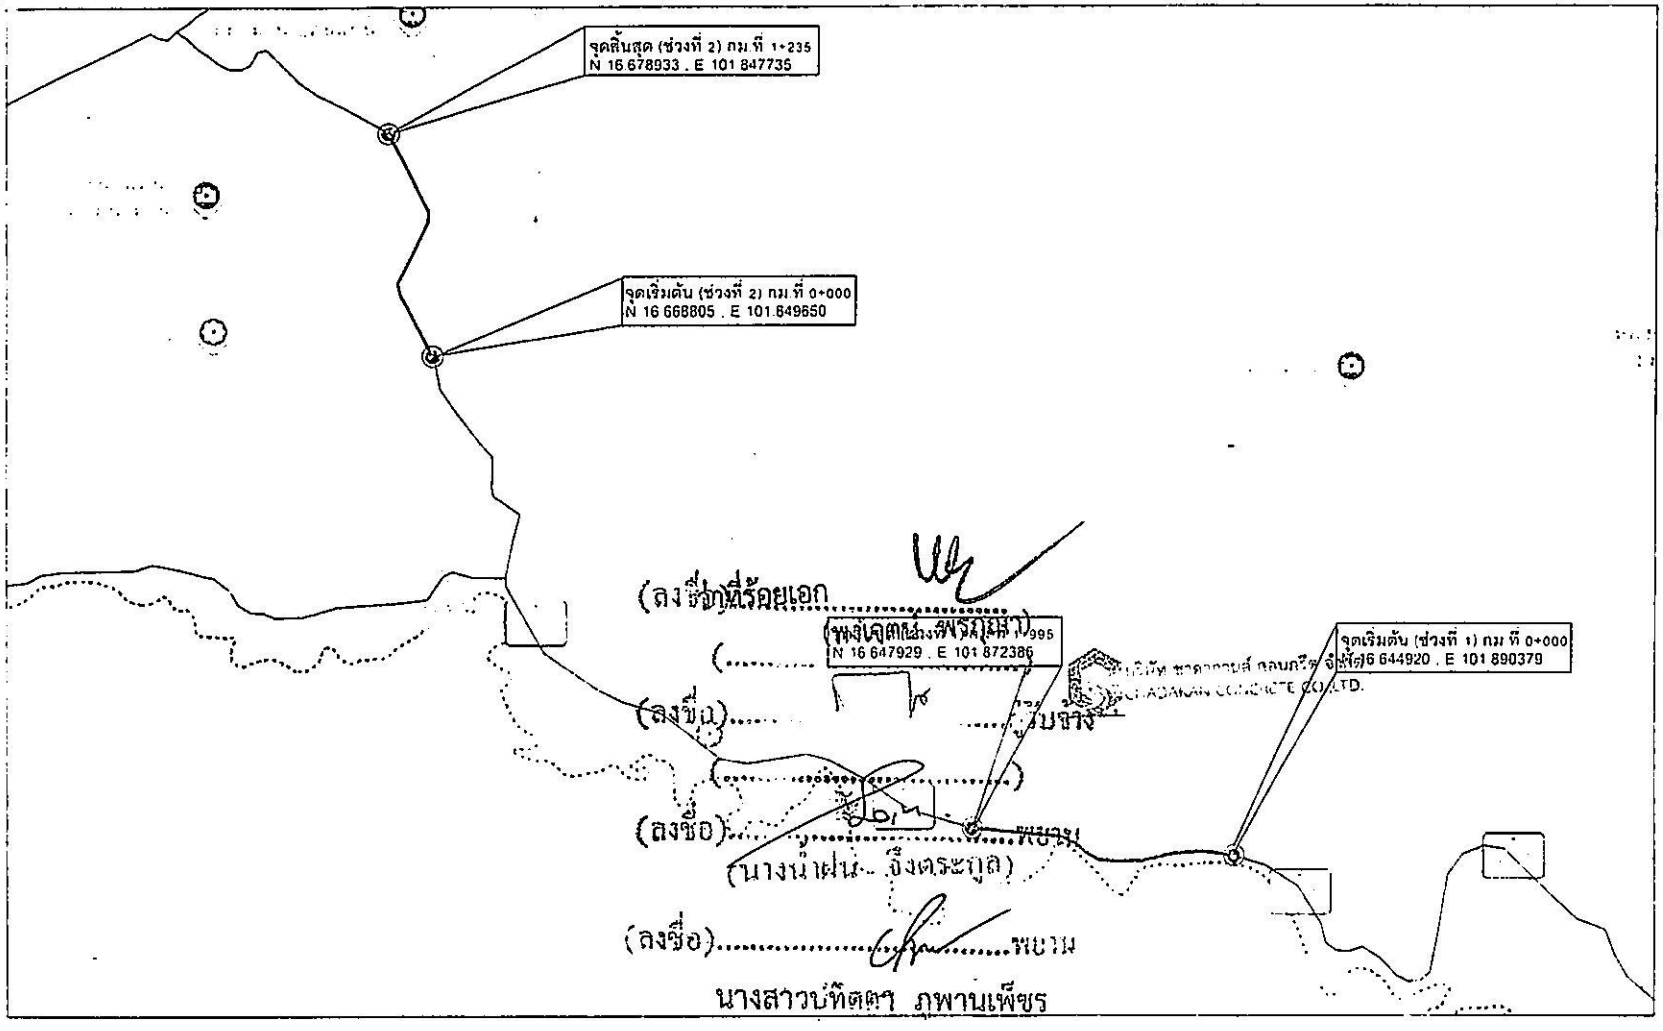



อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุฎา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ
การปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ปรับความกว้าง ยาว ตามความเหมาะสม ตามสภาพพื้นที่จริง โดยให้พื้นที่ตารางเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน

รายละเอียดโครงการ

1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
   ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,995 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,235 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาวรวม 3,230 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 19,380 ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
2. มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
3. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันเกิดจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการจัดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
5. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ
6. ระยะเวลาการก่อสร้างได้เผื่อระยะเวลารอผลทดสอบไว้แล้ว หากทำงานล่าช้า จะนำเอาเหตุรอผลทดสอบมาลดหย่อนคาปรับไม่ได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	ผู้ควบคุมงาน นายนครศรี เชียงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประธานกรรมการฯ นายกรี ศิริชาติ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชาง
แสดงแบบ แผนที่จังหวัด	ตัวแทนผู้รับจ้าง นางสาวกาญจนา เพชรพ ตำแหน่งสวนจำกัด ราชสีมา เพชรพ ผู้ควบคุมงาน	กรรมการฯ นางสาวบัทิตตา ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
เลขที่แบบ แผนที่		นางสาวพรทิพา ปาลีย นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.1-0007 บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง (เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง (ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย		ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	19,380.00	ตร.ม.	1.94	37,597.20	19,380.00	ตร.ม.	1.94	37,597.20	
2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	19,380.00	ตร.ม.	16.37	317,250.60	19,380.00	ตร.ม.	16.37	317,250.60	
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.	19,380.00	ตร.ม.	322.50	6,250,050.00	19,380.00	ตร.ม.	322.50	6,250,050.00	
4	งานตีเส้นจราจร	727.00	ตร.ม.	260.12	189,107.24	727.00	ตร.ม.	260.12	189,107.24	
	วงเงินตามเสนอ				6,794,005.04				6,794,005.04	
	ปรับราคาตามสัญญาจ้าง (เดิม)				6,794,000.00				6,794,000.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม)						ราคาก่อสร้างจริง		6,794,000.00	
	ผลต่างค่างาน (ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง)								-	
	ปรับราคาคิดเพียง				(หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				6,794,000.00	

(ลงชื่อ) วาที่ร้อยเอก.....
(พงเจตน์ พรกุณา)
(.....)
(ลงชื่อ).....
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนำผิน จังตระกูล)
(ลงชื่อ).....พยาน
นางสาวปทัตตา ภูพานเพ็ชร

(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายธนกฤต เปรี่ยวจำเริญ)

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายกวี ศิริชาติวาปี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางบุษกร ศรีสุวรรณ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวพรทิพา ราชสีทา)

ห้างยินดีจะดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด
โดยไม่เรียกร้องค่างานในส่วนที่เพิ่มขึ้น/ลดลง แต่อย่างใด
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เทพมง)

บริษัท ชาลากานต์ คอนกรีต จำกัด
CHADAKAN CONCRETE CO.,LTD.

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ,สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง และได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๑๐/๒๕๖๙	๔,๐๗๖,๔๐๐.๐๐			๔,๐๗๖,๔๐๐.๐๐
๒	๒	๐๘/๐๓/๒๕๗๐	๒,๗๑๗,๖๐๐.๐๐			๒,๗๑๗,๖๐๐.๐๐

บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด
CHADAKAN CONCRETE CO.,LTD.

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ ฟรีกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกาญจนา เทพมง)



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๓๘๔๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง แก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาตากานต์ คอนกรีต จำกัด

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๒๖๒๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้บริษัทฯ หยุดงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ,สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทราบรายละเอียดการแก้ไขแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการแก้ไขสัญญาครั้งนี้ อยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิมจำนวน ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอให้ท่านไปลงนามในสัญญาจ้าง ฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดซื้อ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ว่าจ้าง บริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ,สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานตามหนังสือบริษัท ฯ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ขออนุมัติแก้ไขสัญญา รายละเอียดดังนี้

๑. เหตุแห่งการแก้ไขสัญญา เนื่องจาก สภาพพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระยะทางรวม ๒,๐๐๐ เมตร ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา จึงต้องทำการแก้ไขแบบรูปรายการให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และแจ้งส่งมอบพื้นที่ได้ ตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕/๑๒๖๒๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามสัญญา ดังนี้

รายละเอียดโครงการ เดิม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาวรวม ๓,๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๘๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๔๙๙๕๐ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๖๕๘๙๑
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๗๘๙๓๓ ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๗๗๓๕

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการ แก้ไขใหม่เป็น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑-๐๐๐๗ บ้านท่ากระบือ - บ้านวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาวรวม ๓,๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๓๘๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ - กม. ๑+๙๙๕

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๔๔๙๒๐ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๙๐๓๗๙

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๔๗๙๒๙ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๗๒๓๘๕

ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ กม.๐+๐๐๐ - กม. ๑+๒๓๕

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๖๘๘๐๕ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๙๖๕๐

จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด ละติจูด ๑๖.๖๗๘๙๓๓ , ลองจิจูด ๑๐๑.๘๔๗๗๓๕

รายละเอียดตามหนังสือ สำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๖๘๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ และการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างครั้งนี้ อยู่ในวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ปริมาณงานรวมไม่เปลี่ยนแปลง วงเงินตามสัญญาเดิม รายละเอียดตามบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา โดย บริษัทฯ รับทราบและยินดีให้ปรับเปลี่ยนปริมาณงานและยินยอมรับเงินค่าจ้างตามวงเงินในสัญญาเดิม เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. การขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้าง หลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๔. การแก้ไขสัญญา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) , (๓) และ (วรรคสอง) โดยการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ และเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป และข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

/๕. การแก้ไข...

๕. การแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๙ (๒) และ (๓) อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(วรรคสอง) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ในกรณี (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตาม มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญา ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

/๑.๓ ระเบียบ...

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง โดยแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๒. ขยายระยะเวลาให้ผู้รับจ้าง โดยนับจากวันที่แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนถึงวันที่แจ้งส่งมอบพื้นที่ คือ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ รวมระยะเวลา ๗๒ วัน โดยวันสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง คือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๗๐

๓. แจ้งบริษัท ชาดากานต์ คอนกรีต จำกัด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จึงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง
18 พ.ย 69

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
18 พ.ย. 69.

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรคุณา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 พ.ย. 2569

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ๗.๙.๖๙
