สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๙ หมู่ ๑๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวจิลลาภัทร อ้วนพรมมา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๐๒๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน สาย ขก.ถ.๑-๐๐๔๙ (สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๗,๙๖๑.๑๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา) (นางสาวจิลลาภัทร อ้วนพรมมา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ข้อความใดที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรกุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิลลาภัทร อ้วนพรมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐเรืองคอนกรีต

แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน สายขก.ถ.1-0049
(สายบ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่)
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ 326/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันเริ่มต้นสัญญา 3 กุมภาพันธ์ 2569
วันสิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2569
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับจ้าง หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
ค่างาน 17,227,961.10 บาท
ค่าปรับ 43,069.90 บาท / วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	% ของงาน	ก.พ.-69 1-2	3-15	16-23	24-28	มี.ค.-69 1-8	9-16	17-23	24-31	เม.ย.-69 1-8	9-16	17-23	24-30	พ.ค.-69 1-8	9-16	17-23	24-31	มิ.ย.-69 1-2	3-15	16-23	24-30	% ผลงาน
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	5,160.00	2.24	,558.40	0.067%		50	50																		
2	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ถูกรัง)	ลบ.ม.	77.40	132.20	10,. 2.28	0.059%		50	50																		
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	225.70	975.48	20,164.94	1.278%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15.00 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,515.00	537.11	,425,051.65	14.076%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
5	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	84.00	376.67	31,640.28	0.184%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
6	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	364.00	183.78	66,895.92	0.388%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
7	รอยต่อตามยาว (LONGUTUDINAL JOINT)	เมตร	645.00	76.68	49,458.60	0.287%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
8	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	145.13	374.89	54,407.78	0.316%																50	50				
9	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	45,000.00	2.24	100,800.00	0.585%		50	50																		
10	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	40,000.00	19.77	790,800.00	4.590%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
11	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (บน TACK COAT)	ตร.ม.	40,000.00	326.13	13,045,200.00	75.722%				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10						
12	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	1,125.00	374.89	421,751.25	2.448%																50	50				
	TOTAL				17,227,961.10	100.000%	1				2				3				4				5				
							ประจำสัปดาห์	0.00	0.36	0.36	4.83	4.83	4.83	4.83	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	
							สะสม	0.00	0.36	0.71	5.54	10.36	15.19	20.02	29.67	39.32	48.97	58.63	68.28	77.93	87.58	97.24	98.62	100.00	0.00	0.00	0.00	
	แผนงาน		% แผนงาน				ประจำเดือน	5.54				24.13				38.61				30.34				1.38				
							สะสม	5.54				29.67				68.28				98.62				100.00				
							จำนวนเงิน	953,955.28				4,157,322.36				6,651,715.78				5,226,877.26				238,090.42				
							สะสม	953,955.28				5,111,277.64				11,762,993.42				16,989,870.68				17,227,961.10				
							ประจำสัปดาห์																				
							สะสม																				
							ประจำเดือน																				
							สะสม																				
							จำนวนเงิน																				
							สะสม																				

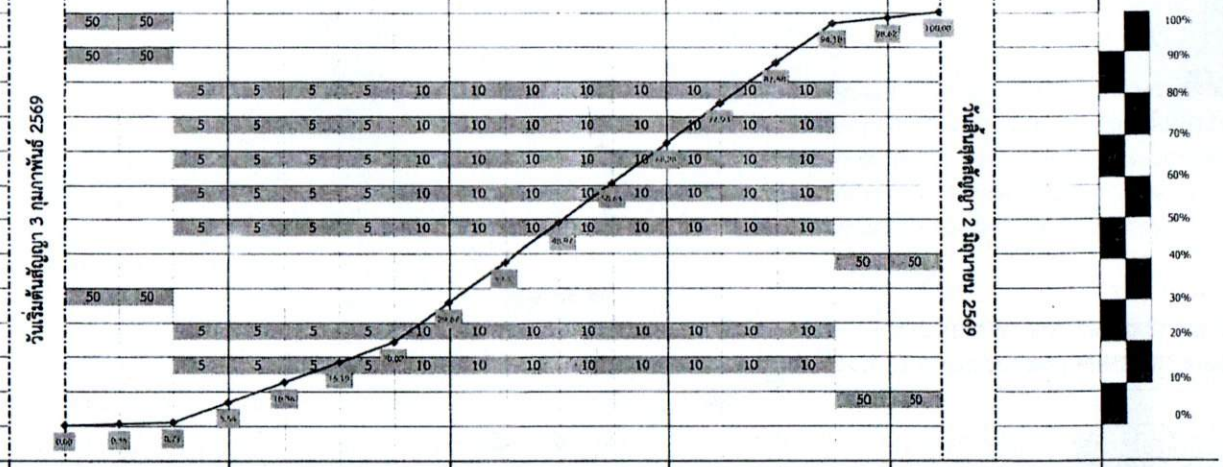

ว่าที่ร้อยเอก (พงเจตน์ พรกุญา)

ลงชื่อ ..... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต
(นายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

ลงชื่อ.....
(นายกิตติพงษ์ จันทร์หอม)
วิศวกรโครงการผู้รับจ้าง ภย.87986
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวจิตติ ดุลติเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
